

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2019

Localidad de
Suba

Secretaría Distrital de Planeación

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

CONTENIDO

1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL	3
2. INTRODUCCIÓN	4
3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL	5
3.1 EJECUCIÓN POR METAS	11
4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	15
5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL	19
5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN	29
6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS	42
7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019	46
8. ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2019	0



1. MENSAJE DEL ALCALDE LOCAL

Cordial saludo para todos.

Queridos habitantes de la localidad de Suba, el 2019 fue un gran año para la localidad; hoy podemos decir que hemos cumplido y que vamos por buen camino, avanzando en el propósito de que la localidad de Suba tenga una mejor calidad de vida y que, por ende, sus habitantes sean más felices.

La alcaldía local se permite presentar este documento en cumplimiento de la normatividad nacional y distrital vigentes, con el fin de mostrar las acciones y actividades que se realizaron durante el 2019, para avanzar en el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo local “Suba mejor para todos- XUA CHIE, GUECHAS”.

MIGUEL ANTONIO CORTES GARAVITO
Alcalde Local de Suba (E)



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

2. INTRODUCCIÓN

Agradecemos a los habitantes de esta gran localidad por brindarnos la confianza para llevar a cabo nuestra labor administrativa durante la vigencia 2019. Gracias a nuestro trabajo y su participación hemos avanzado en hacer de la Localidad de Suba un mejor lugar de convivencia en paz, con cultura ciudadana, con mejores espacios públicos amigables y respetuosos del medio ambiente.

El 2019 fue de grandes avances y experiencias, donde se sumaron esfuerzos para abordar y solucionar las problemáticas locales que afectan a nuestros diferentes grupos poblacionales; se adelantaron importantes inversiones sociales que apuntaron a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Fue un año de muchos retos que han hecho que nuestra administración local sea mucho más integral, eficiente en su gestión, transparente y accesible para todos; es por eso que en el Informe de Competencia No1 de Colombia Compra Eficiente la Alcaldía Local de Suba es la décima entidad estatal a nivel nacional con mayores promedios en recepción de ofertas por medio de la plataforma SECOP II, lo que se traduce en que estamos realizando buenas prácticas administrativas en los procesos de selección de proveedores de bienes y servicios para nuestra localidad.

Este documento consta de cinco partes en las cuales se muestra con transparencia la gestión de la administración; la primera parte, presenta un balance general del plan de acción y cumplimiento de metas, la segunda un análisis presupuestal de la vigencia 2019, la tercera contiene los logros más importantes para la vigencia, la cuarta muestra las principales dificultades a las cuales nos enfrentamos y la última es un informe sobre los procesos contractuales.




3. BALANCE GENERAL ACUMULADO DE LOS PDL

AVANCE PONDERADO PLAN DE DESARROLLO LOCAL

El avance del Plan de Desarrollo Local -PDL responde a un cálculo que tiene en cuenta la evolución de cada meta, programa, eje o pilar de acuerdo a la metodología de ponderación establecida por la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Se entiende que el avance acumulado se calcula con base en el periodo de vigencia del plan, es decir, cuatro años (2017-2020), por lo que para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Este porcentaje, aplica para los cálculos relacionados con el avance del plan, pilar y eje, programa, sector y proyecto de inversión.

Dado lo anterior y como se muestra en la gráfica No. 1 la localidad de Suba a 31 de diciembre de 2019 presentó un avance acumulado contratado¹ del PDL del 70,1%. Por su parte, en cuanto a los bienes y servicios entregados² a esa fecha, el plan presentó un avance del 61,2%, lo que indica que el 87,3% de lo contratado fue entregado.

Gráfica No. 1. Porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

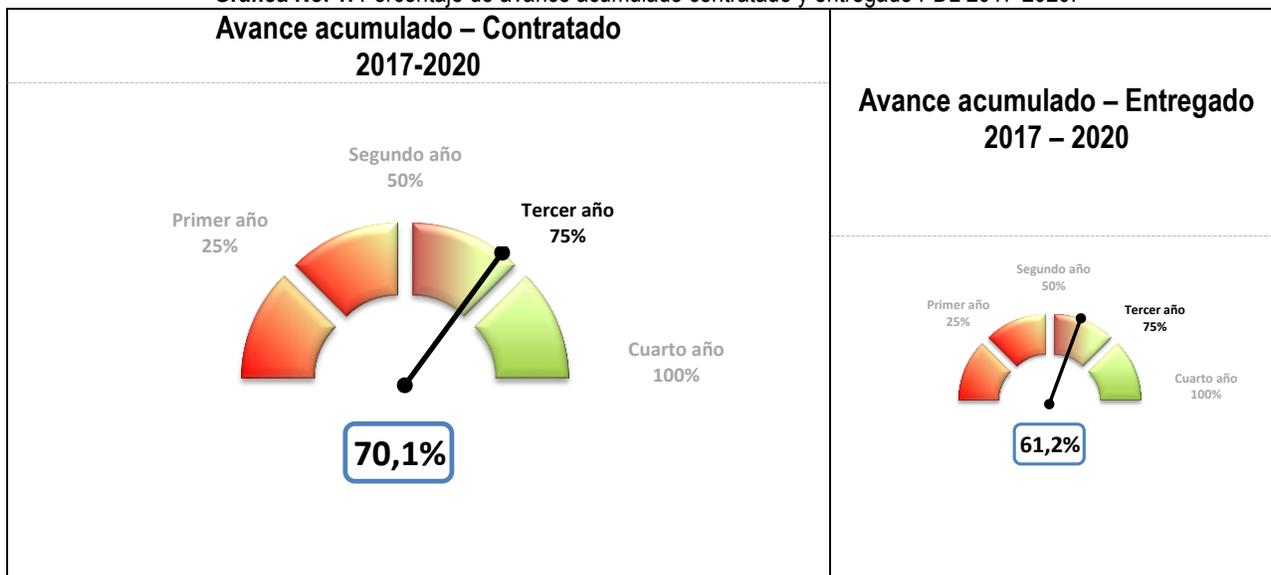

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019


¹ La ejecución de la meta según lo contratado hace referencia a los bienes y servicios que se espera entregar a través de las contrataciones realizadas, en relación con la magnitud programada para la meta.

² La ejecución de la meta según lo entregado hace referencia a los bienes y servicios que ya se han entregado a través de las contrataciones realizadas.



Frente a la ejecución anual del PDL, el avance según lo contratado tuvo su mayor crecimiento porcentual en la vigencia 2019 con un 21,1% de incremento y el mayor avance conforme a los bienes y servicios entregados también se presenta en la vigencia 2018 con un incremento del 28,3%.


Gráfica No. 2. Evolución del porcentaje de avance acumulado contratado y entregado PDL 2017-2020.

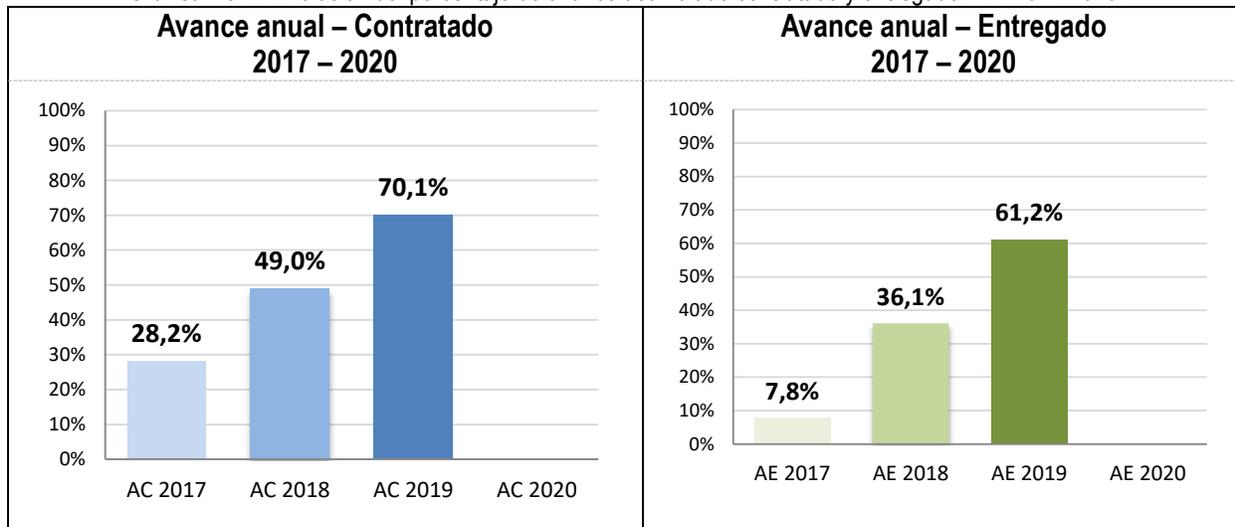

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

A corte del 31 de diciembre de 2019 las localidades en promedio han logrado un avance acumulado contratado de su PDL igual a 79,9%. Con respecto a las otras localidades, la localidad de Suba ocupa el décimo séptimo lugar de avance contratado de su PDL. Para el caso del avance entregado, el promedio se sitúa en 58,8% dadas las dificultades tanto en los tiempos de ejecución como en el rezago presupuestal. En este aspecto, la localidad ocupa el puesto noveno.

Gráfica No. 3. Ranking de avance PDL por localidad.

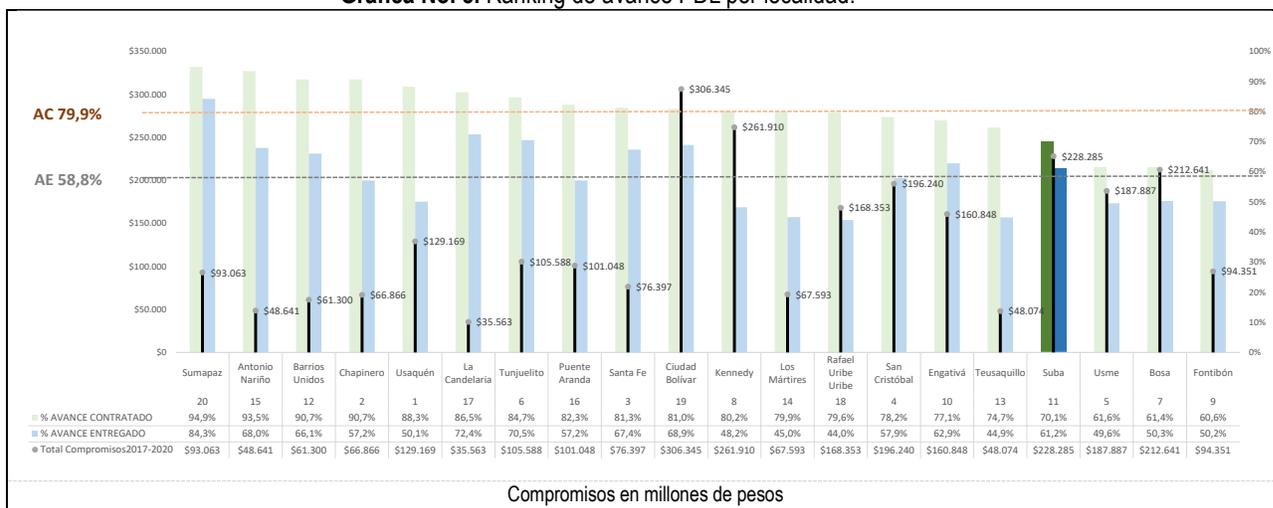

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PILAR Y EJES DEL PLAN

En lo que respecta al avance por pilar y ejes del PDL, se tiene que el mayor porcentaje de avance acumulado contratado lo presentó el eje Sostenibilidad ambiental (90.2%), que incluye los temas relacionados con acciones de renaturalización y/o ecourbanismo y coberturas verdes. En segundo lugar, está el eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia (79,3%) que incluye los temas relacionados con participación, inspección, vigilancia y control – IVC y el fortalecimiento institucional. Y en tercer lugar, el pilar construcción de comunidad y cultura ciudadana (77,4%) que incluye los temas relacionados con dotación en seguridad y ejercicios de convivencia ciudadana. El mayor avance frente a los bienes y servicios entregados corresponde al pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana (76,9%).

Gráfica No. 4. Avance por pilar o eje.

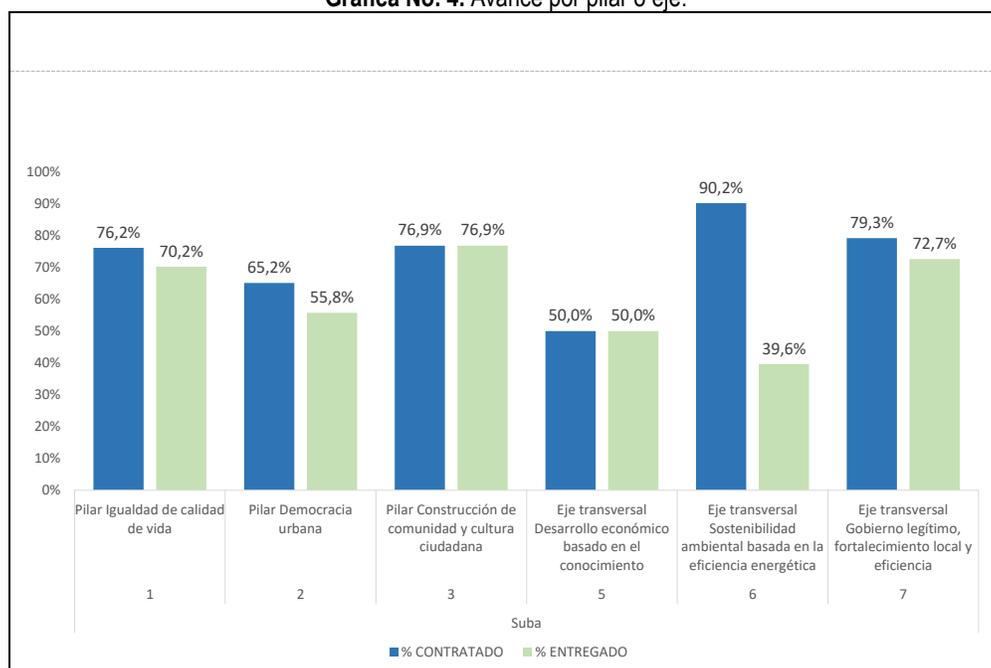

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AVANCE POR PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO

Para lograr los objetivos establecidos en su PDL, la localidad de Suba cuenta con 12 programas de los cuales sobresalen, con un avance contratado del 100%, “Infraestructura para el desarrollo del hábitat” y “Desarrollo rural sostenible”; también es de resaltar el programa “Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación”, con una ejecución contratada del 91%. El programa que mayores recursos comprometió en la vigencia 2019 fue Mejor movilidad para todos con \$33.407millones.

Gráfica No. 5. Avance programas.

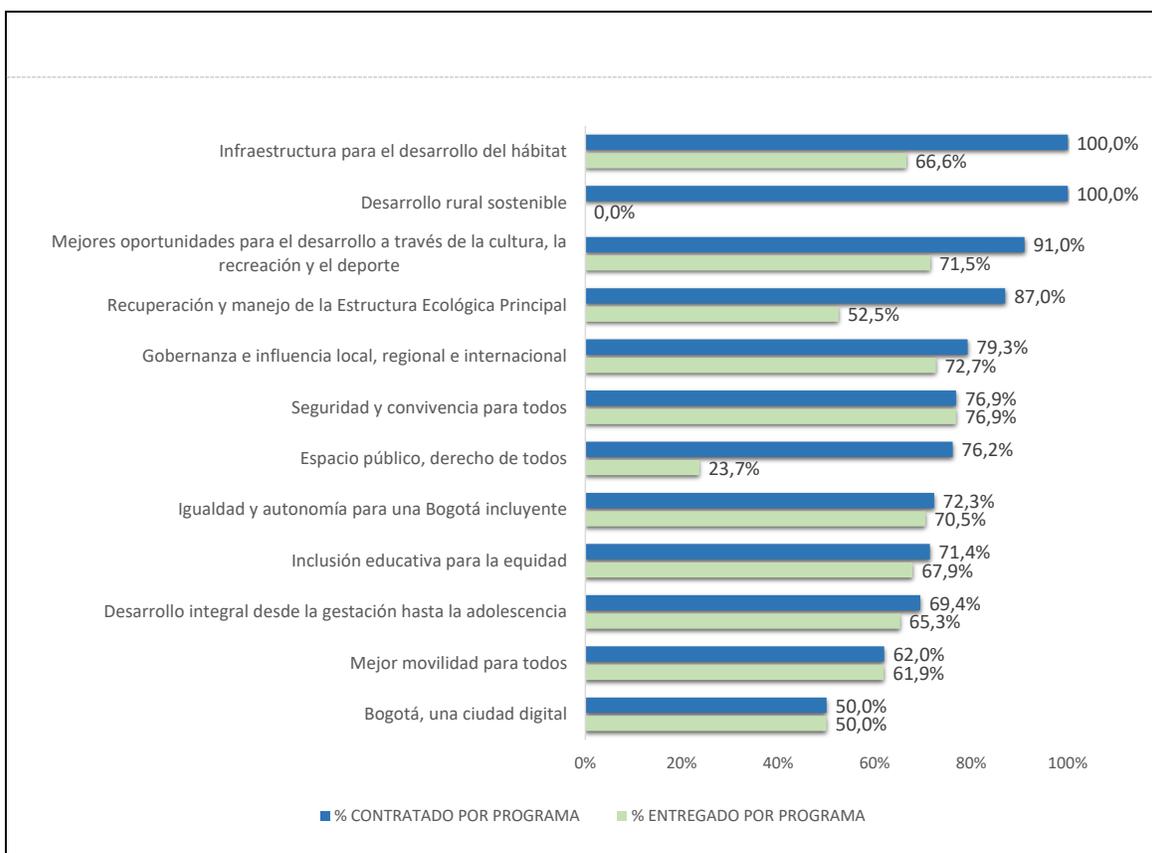

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN LOCAL

Para avanzar en el cumplimiento de las metas del PDL de Suba, la Alcaldía Local ha ejecutado recursos en 15 proyectos de inversión. A continuación, se presenta el avance acumulado contratado de cada uno de ellos, con el presupuesto comprometido por vigencia.

Tabla No. 1. Avance por proyecto de inversión.

Código Proyecto	Nombre Proyecto	AVANCE CONTRATADO	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017 2020
3-3-1-15-01-02-1426-00	Primera infancia mejor para Suba	69,4%	\$956	\$619	\$539	\$2.114
3-3-1-15-01-03-1427-00	Suba digna e igualitaria	72,3%	\$7.916	\$8.646	\$10.187	\$26.749
3-3-1-15-01-07-1457-00	Suba es educación mejor para todos	71,4%	\$485	\$600	\$600	\$1.685
3-3-1-15-01-11-1459-00	Una Suba mejor a través de la cultura, la recreación y el deporte	91,0%	\$2.656	\$2.801	\$2.679	\$8.136
3-3-1-15-02-13-1466-00	Suba aprovecha integralmente los residuos	100,0%	-	-	\$117	\$117
3-3-1-15-02-15-1461-00	Suba mejora integralmente sus barrios	100,0%	\$276	-	\$278	\$554
3-3-1-15-02-17-1465-00	Parques en la ciudad del espacio público	76,2%	\$6.127	\$7.833	\$7.555	\$21.515
3-3-1-15-02-18-1506-00	Hacia una movilidad sostenible	62,0%	\$47.200	\$38.185	\$33.407	\$118.792
3-3-1-15-03-19-1469-00	Suba segura y mejor para todos	76,9%	\$5.006	\$2.961	\$2.687	\$10.655
3-3-1-15-05-36-1504-00	Conexión clave para la información	50,0%	-	\$102	\$193	\$295
3-3-1-15-06-38-1472-00	Más árboles y mejor calidad del aire en Suba	87,0%	\$540	\$2.052	\$1.708	\$4.301
3-3-1-15-06-41-1476-00	Suba promueve el desarrollo rural sostenible	100,0%	-	-	\$211	\$211
3-3-1-15-07-45-1478-00	Fortalecimiento institucional en Suba	79,7%	\$5.395	\$5.451	\$8.358	\$19.203
3-3-1-15-07-45-1481-00	Suba comprometida con la Inspección la vigilancia y el control	75,0%	\$1.904	\$3.345	\$4.017	\$9.265
3-3-1-15-07-45-1483-00	Suba se expresa y decide	83,2%	\$1.885	\$1.431	\$1.378	\$4.695

Cifras en millones pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

NIVEL DE AVANCE POR METAS

En cuanto al nivel de avance de metas por estructura de plan, para el cierre de la vigencia 2019 el avance esperado corresponde al 75%. Dado que es una medición acumulada (2017-2020), según los tres niveles de clasificación de avance de las metas del plan de desarrollo, el nivel alto significa que tiene avance acumulado igual o superior al 70%, medio cuando su nivel de avance es mayor del 30% y menor del 70%, y el nivel bajo cuando el avance de la meta es menor o igual al 30%.

Para la localidad de Suba, existe un total de 33 metas en el PDL. Del total de metas, 2 presentan un nivel de avance contratado bajo, 7 un nivel medio y 24 un nivel alto. En este sentido, el 93,9% de las metas presentan un avance contratado entre el nivel medio y alto.

Gráfica No. 6. Nivel de avance de metas según lo contratado.



Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

3.1 EJECUCIÓN POR METAS

EJECUCIÓN DE METAS SEGÚN LOS PROGRAMADO VIGENCIA 2019

Este apartado presenta información de la ejecución de metas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta lo programado según Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) de la respectiva vigencia y el avance contratado de las metas en cada pilar o eje. Para el caso de la localidad de Suba, en 2019 se programaron 30 metas, de las cuales, 27 (90%) presentaron avance en la contratación. A continuación, se presentan las metas programadas para la vigencia 2019.

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Tabla No. 2. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Igualdad de calidad de vida.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Dotar 40 jardines infantiles de la Localidad de Suba, para la atención integral a la primera	10,0	10,0	100,0%
Vincular 5000 personas en programas de promoción del buen trato y prevención de violencias en niños y niñas	1.250,0	4.350,0	348,0%
Beneficiar 5100 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad con la entrega de apoyo económico (Tipo C) doce (12) meses al año.	5.100,0	5.100,0	100,0%
Beneficiar 3000 personas en condición de discapacidad y/o en estado de vulnerabilidad con ayudas técnicas y de rehabilitación integral no cubiertas por el POS	750,0	375,0	50,0%
Dotar 28 Institutos de educación distrital IED de la Localidad de Suba con elementos pedagógicos en el marco del proyecto escolar.	28,0	28,0	100,0%
Realizar 100 eventos locales de expresión cultural y artística.	25,0	29,0	116,0%
Realizar 16 eventos recreativos, deportivos y de actividad física en parques y espacios públicos de la Localidad de Suba.	4,0	5,0	125,0%
Vincular 3600 personas en procesos de formación artística y cultural informal y aficionada por ciclo vital y con enfoque diferencial	900,0	1.200,0	133,3%
Vincular 4000 personas en procesos de formación deportiva para promover la recreación y actividad física, en parques y espacios públicos de la Localidad	1.000,0	3.200,0	320,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Pilar 2. Democracia urbana.

Tabla No. 3. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Democracia urbana.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 9 estudios preliminares para la regularización urbanística a asentamientos de origen informal previamente legalizados y priorizados en los territorios diagnosticados por la SDHT	1,0	6,0	600,0%
Construir 8 parques vecinales y/o de bolsillo en la Localidad de Suba	3,0	3,0	100,0%
Intervenir 240 parques vecinales y/o de bolsillo de la Localidad de Suba	80,0	75,0	93,8%
Construir 46 Km/carril de malla vial en la Localidad de Suba	30,0	13,8	45,8%
Mantener 62 Km/carril con acciones de movilidad en la malla vial de la Localidad de Suba	-	20,4	
Construir 55000 m2 de espacio público en la Localidad de Suba	4.162,0	-	-
Mantener 25000 m2 de espacio público en la Localidad de Suba	6.112,0	17.482,0	286,0%
Implementar 2 procesos de recolección y clasificación de residuos sólidos aprovechables	2,0	2,0	100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Pilar 3. Construcción de comunidad.

Tabla No. 4. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Pilar Construcción de comunidad.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 dotaciones con soluciones tecnológicas para la seguridad de la localidad	1,0	1,0	100,0%
Vincular 6000 personas a ejercicios de convivencia ciudadana	1.500,0	9.106,0	607,1%
Construir y/o adquirir 3 CAI en la Localidad con el fin de contribuir en la eliminación de los delitos que afectan la convivencia ciudadana.	1,0	-	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Tabla No. 5. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética.

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Intervenir y/o sembrar 5000 árboles con acciones de manejo integral	1.000,0	1.800,0	● -
Adecuar 2 Héctareas de espacio público con intervenciones de renaturalización y/o	0,5	-	● -
Intervenir 10000 m2 con acciones de jardinería, muros verdes y/o paisajismo	1.500,0	5.000,0	● 333,3%
Beneficiar 100 personas en proyectos de emprendimiento rural	25,0	100,0	● 400,0%
Beneficiar 200 personas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia en tecnologías ambientales sostenibles	50,0	200,0	● 400,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Tabla No. 6. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Realizar 4 estrategias de fortalecimiento institucional.	1,0	1,0	● 100,0%
Realizar 4 acciones de Inspección Vigilancia y Control	1,0	1,0	● 100,0%
Fortalecer 160 organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas de participación de la localidad de suba de la localidad de Suba	40,0	60,0	● 150,0%
Vincular 30000 personas en procesos de participación ciudadana y/o control social.	7.500,0	7.500,0	● 100,0%

Eje transversal. Desarrollo económico basado en el conocimiento.

Tabla No. 7. Seguimiento a lo programado vigencia 2019. Eje Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento

Meta proyecto	Magnitud programada meta proyecto 2019	Magnitud contratada meta proyecto 2019	% de avance frente a lo programado anual
Implementar 1 estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC	1,0	1,0	● 100,0%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



EJECUCIÓN DE METAS ACUMULADA 2017-2020

La siguiente tabla presenta el detalle de indicadores de las Líneas de Inversión Local teniendo en cuenta su avance contratado y entregado acumulado.

Tabla No. 8. Avance acumulado por Líneas de Inversión Local e indicador.

Cód	Línea de Inversión	Nombre Indicador	Tipo de anualización	Magnitud Programada 2017-2020	Magnitud Contratada 2017-2020	Magnitud Entregada 2017-2020	% Avance Acumulado contratado 2017-2020	% Avance Acumulado Entregado 2017-2020
1	Malla vial, espacio público y peatonal	Km/carril de malla vial local construido	Suma	46	16	24	35,3%	52,2%
		Km/carril de malla vial local mantenido	Suma	62	89	53	144,2%	85,5%
		m2 de espacio público construidos	Suma	55.000	3.000	537	5,5%	1,0%
		m2 de espacio público mantenidos	Suma	25.000	31.982	68.045	127,9%	272,2%
		Puentes vehiculares y/o peatonales, de escala local sobre cuerpos de agua intervenidos	Suma	2	-	-	-	-
2	Parques	Parques vecinales y/o de bolsillo construidos	Suma	8	5	-	62,5%	-
		Parques vecinales y/o de bolsillo intervenidos	Suma	240	191	71	79,6%	29,6%
3	Seguridad y convivencia	Dotaciones para seguridad realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Personas vinculadas a ejercicios de convivencia ciudadana	Suma	6.000	10.606	11.606	176,8%	193,4%
4	Inspección, vigilancia y control - IVC	Acciones de inspección, vigilancia y control realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
		Estudios preliminares para la regularización urbanística (levantamiento topográficos y	Suma	9	15	-	166,7%	-
5	Atención a población vulnerable_Subsidio C	Personas con subsidio tipo C beneficiadas	Constante	5.100	3.825	3.825	75,0%	75,0%
6	Gestión pública local	Estrategias de fortalecimiento institucional realizadas	Suma	4	3	3	75,0%	75,0%
7	Atención a población vulnerable	Personas beneficiadas con ayudas técnicas no POS	Suma	3.000	1.875	1.627	62,5%	54,2%
		Personas vinculadas a acciones de promoción del buen trato infantil	Suma	5.000	6.850	10.698	137,0%	214,0%
8	Dotación	IED dotados con material pedagógico	Constante	28	20	19	71,4%	67,9%
		Jardines infantiles adecuados	Suma	9	3	3	33,3%	33,3%
		Jardines infantiles dotados	Suma	40	30	25	75,0%	62,5%
10	Procesos de formación artística, cultural y deportiva	Personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural	Suma	3.600	3.000	1.914	83,3%	53,2%
		Personas vinculadas a procesos de formación deportiva	Suma	4.000	7.770	6.580	194,3%	164,5%
11	Eventos artísticos, culturales y deportivos	Eventos artísticos y culturales realizados	Suma	100	95	60	95,0%	60,0%
			Suma	16	14	11	87,5%	68,8%
12	Protección y recuperación de los recursos ambientales	Arboles sembrados o intervenidos	Suma	5.000	4.850	4.961	97,0%	99,2%
		Hectáreas de espacio público intervenidas con acciones de renaturalización y/o	Suma	2	1	1	50,0%	35,0%
		m2 de espacio público intervenidos con acciones de jardinería, muros verdes y/o	Suma	10.000	10.000	4.181	100,0%	41,8%
		Personas beneficiadas a través de emprendimientos rurales	Suma	100	100	-	100,0%	-
		Personas beneficiadas con acciones de asesoría técnica agropecuaria y/o asistencia	Suma	200	200	-	100,0%	-
13	Participación	Organizaciones, instancias y expresiones sociales ciudadanas fortalecidas para la	Suma	160	148	74	92,5%	46,3%
		Personas vinculadas a procesos de participación ciudadana y/o control social	Suma	30.000	22.500	17.685	75,0%	59,0%
15	Proyecto estratégico	Estrategias para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC implementadas	Constante	1	1	1	50,0%	50,0%
		Procesos de recolección y clasificación de residuos sólidos aprovechables	Suma	2	2	2	100,0%	100,0%
17	Proyecto estratégico (CAI)	CAIs construidos y dotados	Suma	3	1	1	33,3%	33,3%

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El análisis de la ejecución presupuestal acumulado de las vigencias 2017, 2018 y 2019 se fundamentó en la información reportada por el sistema de Presupuesto Distrital (PREDIS) de la Secretaría Distrital de Hacienda.

La Alcaldía Local de Suba ha comprometido un presupuesto acumulado de \$228.285 millones en las vigencias 2017, 2018 y 2019. La mayor cantidad de recursos se comprometieron en la vigencia 2017 con un valor de \$80.346 millones (91,4%). Por su parte el mayor número de recursos girados se presentó durante el año 2019, los cuales fueron por valor de \$19.464 millones (26,7%).

Es importante aclarar que los giros presentados fueron realizados dentro de la misma vigencia en la cual se comprometieron, teniendo en cuenta que una vez pasan la vigencia en la cual fueron comprometidos se constituyen presupuestalmente en obligaciones por pagar.

Gráfica No. 7. Porcentaje de ejecución presupuestal por vigencia del PDL

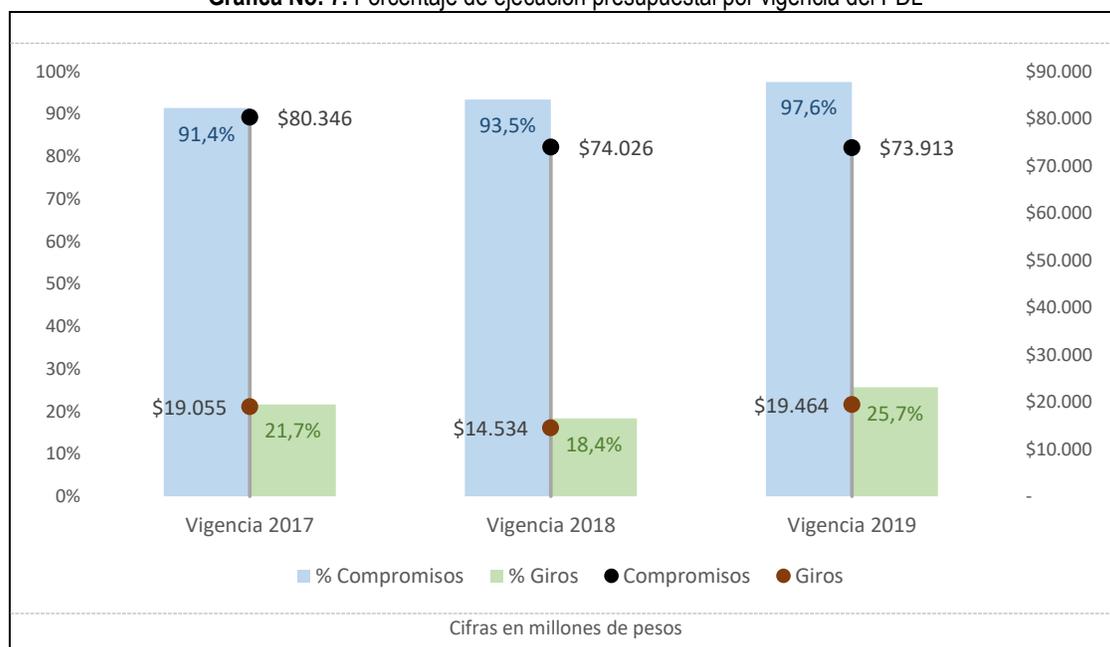

Fuente: PREDIS vigencias 2017, 2018 y 2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR SECTOR

El análisis de la ejecución presupuestal por sector, evidencia que los sectores con mayor cantidad de recursos comprometidos en la vigencias 2017, 2018 y 2019 son Movilidad \$118.792 millones que representa el 52% del total del presupuesto de inversión, Gobierno con \$33.163 millones (14,5%) y Cultura, recreación y deporte \$29.651 millones (13,0%).

Tabla No. 9. Ejecución Presupuestal por sector. Diciembre 2019.

SECTOR	Compromisos 2017	Compromisos 2018	Compromisos 2019	Total. Compromisos 2017-2020	% Compromisos 2017-2020
Sector Movilidad	\$47.200	\$38.185	\$33.407	\$118.792	52,0%
Sector Gobierno	\$9.183	\$10.227	\$13.752	\$33.163	14,5%
Sector Cultura, recreación y deporte	\$8.783	\$10.634	\$10.234	\$29.651	13,0%
Sector Integración social	\$7.116	\$7.638	\$9.976	\$24.730	10,8%
Sector Seguridad, Convivencia y Justicia	\$5.006	\$2.961	\$2.687	\$10.655	4,7%
Sector Ambiente	\$540	\$2.052	\$1.919	\$4.512	2,0%
Sector Salud	\$1.756	\$1.627	\$750	\$4.133	1,8%
Sector Educación	\$485	\$600	\$600	\$1.685	0,7%
Sector Hábitat	\$276		\$395	\$670	0,3%
Sector Gestión pública	-	\$102	\$193	\$295	0,1%
TOTALES	\$80.346	\$74.026	\$73.913	\$228.285	100,0%

Cifras en millones de pesos

Fuente: PREDIS vigencia 2019

EJECUCIÓN POR LÍNEAS DE INVERSIÓN LOCAL

Este ítem realiza un análisis con base en las líneas de inversión local. Estas líneas son un instrumento que, dentro del proceso de formulación de los PDL, establecen el marco de referencia con el cual la administración distrital determina una orientación estratégica de las inversiones que se podrán adelantar en el horizonte del plan. Por tanto, las líneas delimitan el marco de actuación presupuestal de las alcaldías locales y describen las finalidades de objetos de gasto de inversión autorizadas a los FDL y, por ende, se convierten en el insumo clave para los gobiernos locales en los cuatro años de mandato.

A continuación se presenta el porcentaje de presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Tabla No. 10. Porcentaje de presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	% POAI 2017	% Compromisos 2017	% POAI 2018	% Compromisos 2018	% POAI 2019	% Compromisos 2019
Anexo 1 (85%)	88,2%	89,7%	84,8%	87,3%	87,8%	88,9%
Atención a población vulnerable_Subsidio C	7,1%	7,7%	8,2%	9,6%	10,3%	12,8%
Gestión pública local	5,5%	6,7%	9,2%	7,5%	9,9%	11,3%
Inspección, vigilancia y control - IVC	3,1%	2,7%	4,1%	4,6%	5,5%	5,8%
Malla vial, espacio público y peatonal	54,6%	58,7%	50,9%	52,4%	48,0%	45,2%
Parques	14,1%	7,6%	10,2%	10,8%	10,1%	10,2%
Seguridad y convivencia	3,9%	6,2%	2,3%	2,5%	4,1%	3,6%
Anexo 2 (15%)	11,8%	10,3%	15,2%	12,7%	12,2%	11,1%
Atención a población vulnerable	2,5%	2,6%	2,8%	2,8%	1,6%	1,5%
Dotación	1,3%	1,4%	1,9%	1,1%	1,2%	1,1%
Eventos artísticos, culturales y deportivos	1,4%	1,2%	0,9%	0,9%	1,5%	1,4%
Participación	2,3%	2,3%	3,4%	2,0%	2,4%	1,9%
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	1,7%	2,1%	2,8%	2,9%	2,1%	2,2%
Protección y recuperación de los recursos ambientales	2,0%	0,7%	3,3%	2,8%	2,7%	2,6%
Proyecto estratégico	0,6%	-	0,1%	0,1%	0,7%	0,4%
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	-	-	1,8%	1,6%	0,9%	-
Proyecto estratégico (CAI)	-	-	1,8%	1,6%	0,9%	-

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019

Es importante tener presente que la Directiva 005 de 2016 estableció los lineamientos de política para las líneas de inversión local en la formulación de los Planes Locales de Desarrollo 2017-2020, señaló que el 85% de la inversión se realizaría en temas estratégicos distribuidos en 50% en Malla vial, espacio público y peatonal; 10% Parques y 10% Gestión Pública Local; 6% Atención a población vulnerable; 5% Seguridad y Convivencia, 4% Inspección, vigilancia y control – IVC.

En los temas estratégicos del Plan de Desarrollo Local de Suba, los mayores recursos comprometidos del PDL en las líneas de inversión priorizadas durante el periodo 2017, 2018 y 2019 fueron: “Malla vial, espacio público y peatonal” con un monto de \$118.792 millones, “Atención a población vulnerable subsidio C” con \$22.617 millones y “Parques” con \$21.515 millones.

Dentro de las otras inversiones del plan (15%), las líneas de inversión que han comprometido más recursos durante el periodo del PDL son: “Procesos de formación artística, cultural y deportiva” con un monto de \$5.445 millones “Atención a población vulnerable” con \$5.265 millones, y “Participación” con \$4.695 millones.

A continuación, se presenta el presupuesto comprometido por cada una de las Líneas de Inversión Local en cada vigencia del PDL:



Tabla No. 11. Presupuesto comprometido por Líneas de Inversión Local.

Anexos Línea de inversión	POAI 2017	Compromisos 2017	POAI 2018	Compromisos 2018	POAI 2019	Compromisos 2019	Total Compromisos 2017_2020
Anexo 1 (85%)	\$77.563	\$72.068	\$65.766	\$63.623	\$65.706	\$65.738	\$201.429
Atención a población vulnerable_Subsidio C	\$6.201	\$6.160	\$6.395	\$7.019	\$7.690	\$9.437	\$22.617
Gestión pública local	\$4.823	\$5.395	\$7.103	\$5.451	\$7.403	\$8.358	\$19.203
Inspección, vigilancia y control - IVC	\$2.756	\$2.179	\$3.157	\$3.345	\$4.106	\$4.294	\$9.819
Malla vial, espacio público y peatonal	\$47.949	\$47.200	\$39.462	\$38.185	\$35.898	\$33.407	\$118.792
Parques	\$12.390	\$6.127	\$7.892	\$7.833	\$7.555	\$7.555	\$21.515
Seguridad y convivencia	\$3.445	\$5.006	\$1.757	\$1.790	\$3.054	\$2.687	\$9.484
Anexo 2 (15%)	\$10.335	\$8.278	\$11.757	\$9.232	\$9.143	\$8.175	\$25.685
Atención a población vulnerable	\$2.206	\$2.100	\$2.140	\$2.074	\$1.200	\$1.091	\$5.265
Dotación	\$1.126	\$1.096	\$1.485	\$772	\$915	\$798	\$2.666
Eventos artísticos, culturales y deportivos	\$1.267	\$942	\$664	\$690	\$1.150	\$1.060	\$2.692
Participación	\$2.005	\$1.885	\$2.619	\$1.431	\$1.800	\$1.378	\$4.695
Procesos de formación artística, cultural y deportiva	\$1.464	\$1.715	\$2.150	\$2.111	\$1.550	\$1.619	\$5.445
Protección y recuperación de los recursos ambientales	\$1.770	\$540	\$2.593	\$2.052	\$2.005	\$1.919	\$4.512
Proyecto estratégico	\$496	-	\$106	\$102	\$523	\$309	\$412
Anexo 3 (Construcción Sedes, CAI)	-	-	\$1.400	\$1.171	\$700		\$1.171
Proyecto estratégico (CAI)	-	-	\$1.400	\$1.171	\$700		\$1.171

Cifras en millones de pesos

Fuente: Matriz Unificada de Seguimiento a la Inversión, Corte 31-12-2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

5. PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PDL

Pilar 1. Igualdad de calidad de vida.

Jardines Infantiles

Proyecto 1426: Primera Infancia Mejor para Suba: Con respecto al componente de dotación de jardines infantiles, en el año 2019 se realizó la dotación de 10 jardines infantiles de la Localidad de Suba operados por la Secretaría Dsitrrial de Integración Social, los cuales se dotaron con recursos de la vigencia 2018, así mismo se llevo a cabo un proceso de contratación para la dotación de 10 jardines infantiles y cumplir lo propuesto para la vigencia 2019.

Buen trato

Proyecto 1426: Primera Infancia mejor para Suba: A través del componente de buen trato, en la vigencia 2019 se vincularon a la promoción del buen trato y la prevención de la violencia más de 9400 personas, con lo cual se cumplió la meta en mas del 200%.

Subsidio tipo C

Proyecto 1427: Suba digna e igualitaria. En relación con el componente de Subsidio C, la Alcaldía Local, en compañía de la Secretaría de Integración social y la Secretaría de Gobierno, logró realizar el esfuerzo financiero con el propósito de hacer un aumento en el valor de entrega del apoyo económico tipo C para la vigencia 2019, correspondiente a \$ 5.000 pesos mensuales por beneficiario para un total de \$ 125.000, el cual beneficia a 5.100 personas de la localidad de Suba, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ayudas técnicas

Proyecto 1427: Suba digna e igualitaria. Mediante el componente de ayudas técnicas en la vigencia 2018 se entregaron a 877 usuarios más de 1521 ayudas técnicas y para el año 2019 se entregaron a 1.100 usuarios un total de 1250 ayudas técnicas.



Educación (Dotación de colegios)

Proyecto 1457: Suba es educación mejor para todos. En el desarrollo de los dos últimos años la administración local, logró el cumplimiento de la meta de la dotación de las instituciones educativas públicas de la localidad de Suba, estas acciones se llevaron a cabo a través de convenio interadministrativo con la Secretaría de Educación, quienes son cabeza de sector y a través de cofinanciación con la Alcaldía Local sumaron esfuerzos para llevar una mejor inversión a la población beneficiada de 30 instituciones educativas.

Cultura

En el marco del proyecto 1459 "Una Suba mejor a través de la cultura la recreación y el deporte", del componente de cultura, durante el año 2019, se realizaron 18 eventos artísticos y culturales con enfoque territorial y poblacional, con la participación de 13 mil personas. De otra parte se realizaron seis procesos de formación artística y cultural EFA, con un promedio de 50 horas de duración, en Artes plásticas, Audio visuales, Artes escénicas, Danza, Música y Literatura. A los que se inscribieron 1013 personas. Cinco (5) de los procesos de formación culminaron con concursos donde se promovió el embellecimiento del espacio público, mediante el arte urbano, la cultura ciudadana mediante tomas teatrales, y la promoción de los derechos de las mujeres mediante la danza, los audiovisuales y la literatura.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

**PROYECTO DE INVERSION 1459 DTS
EVENTOS CULTURALES 2019**

	EVENTO	GRUPOS DE INTERES		FECHA	AFORO
1	FESTIVAL GASTRONÓMICO , para la integración familiar, barrio el Pinar Dirección: Carrera 95A # 152-00	Iniciativa JACs Pinar, 12 Conjuntos de PH UPZ 27 SUBA		Fecha: Abril 07 de 2019 Hora: 09:00 a 16:00	512
2	SEMINARIO DE ARTESANOS , enfoque de genero Dirección: Calle 145 carrera 87 Barrio: Suba Centro UPZ: 27	Iniciativa en CLACP, 2017 Colectivo artesanías de Suba.		Fecha: Abril 26 de 2019 Hora: 09:00am a 4:00pm	103
3	FESTIVAL DE MÚSICA COLOMBIANA . Dirección: Calle 114 a # 45-78 Barrio: Alhambra UPZ:	Iniciativa en CLAP, 2017, Jac puente largo, Jac Alhambra, Pasadena, colectivo de música andina de cuerda, UPZ 20 ALAHAMBRA		Fecha: Abril 27 de 2019 Hora: 12:00m a 6:00pm	421

	EVENTO	GRUPOS DE INTERES		FECHA	AFORO
4	FESTIVAL PARA LA INFANCIA "Día de la niñez en Colombia" "Dirección: Calle 136 con Carrera 160	Iniciativa JAC Santa Cecilia 2 y Lisboa UPZ 71 TIBABUYES	 	Fecha: Abril 28 de 2019 Hora: 9:00am a 1:00pm	370
5	DIA DE LA DISCAPACIDAD PORTAL DE SUBA	Iniciativa Consejo local de Discapacidad. Decreto 470 de 2007.		Fecha: Mayo 4 de 2019 Hora: 8:00am a 1:00pm	562
6	DIVERSIDAD CULTURAL PORTAL DE SUBA	Consejo local LGBTI de Suba. Acuerdo 371 de 2009 del Concejo de Bogotá DC		Fecha: Mayo 5 de 2019 Hora: 12:00m a 6:00pm	521
7	PERSONA MAYOR Dirección: Kilometro vía Carrera 6- Cota Barrio: Vereda Chorrillos UPR 1 CHORRILLOS	Consejo Local de "Sabios y Sabias" Decreto 345 de 2010		Fecha: Mayo 22 de 2019 Hora: 12:00m a 6:00pm	590



Deporte

Para las actividades de recreación y deporte, la alcaldía local ha desarrollado acciones de inclusión de la población beneficiada de este proyecto; se realizaron así diversas reuniones con toda la comunidad de la localidad, incluyendo los componentes diferenciales de población, afrocolombianidad, raizales, palenquero, ROM, Indígenas, Discapacitados, LGBTI, Adulto Mayor, lo cual permitió elaborar diferentes anexos técnicos enfocados a garantizar el cumplimiento de la meta pero de manera que las actividades a desarrollar para su cumplimiento fuera a gusto de la población y de manera participativa.



Pilar 2. Democracia urbana.

Estudios preliminares para la regularización urbanística

Proyecto 1461: Suba mejora integralmente sus barrios. Para la Vigencia 2017, la administración local contrató la ejecución de este proyecto; sin embargo al momento de adelantar las acciones de supervisión se identificó incumplimiento del contrato a lo cual se procedió conforme a la normatividad vigente, por lo tanto para la vigencia 2019 se deja contratado el levantamiento topográfico de 6 polígonos para el cumplimiento de la meta del plan, se requiere seguimiento para avanzar con la Secretaría del Habitat en la radicación de los procesos de Regularización, para su respectiva aprobación.

Parques



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Proyecto 1465: Parques en la ciudad del espacio público. Con una inversión superior a los 6.566 millones de pesos, hemos venido trabajando en la intervención de 60 parques de la localidad.

Dentro de los mas representativos podemos encontrar los relacionados a continuacion:

EL SOLAR (11-019) (en etapa final)



ANTONIO GRANADOS 11-020



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**



Dentro del marco de la integralidad y la inclusión, se apuntó a intervenir parques que garanticen y fortalezcan el vínculo y la participación de la ciudadanía y la recuperación de los espacios públicos de la Localidad brindando una nueva imagen y sentido de pertenencia. En la actualidad esta administración se encuentra adelantado las medidas tendientes a subsanar los inconvenientes surgidos con el contrato de obra 3030-2018 y de esta manera garantizar la terminación y puesta en funcionamiento de los 60 parques objeto de intervención.



PARQUE TORRES DE SEGOVIA 11-674



Malla vial y espacio público

Con una inversión superior a los \$ 35 mil Millones de pesos, la Alcaldía local de Suba se enfocó de manera puntual en la conservación de la malla vial de la localidad, en ese orden de ideas mediante contratos de obra 340-18 y 341-18 se adelanta la intervención de malla vial local siendo este el proyecto más relevante en el marco del Plan de Desarrollo Local.

Dando cumplimiento al principio de la Planeación a partir del mes de febrero de 2019 se han venido atendiendo de manera continua e integral los diferentes segmentos que fueron priorizados y que cuentan con viabilidad técnica, jurídica, legal, ambiental entre otras, aunado a esto contamos con la ejecución directa de la entidad, la cual mediante el marco del programa gestión compartida aporta en los avances de intervención de vías locales, espacio público y la zona rural.

Paralelamente se ejecuta el contrato de consultoría de estudios y diseños 345-18 con el cual se espera obtener el listado de los segmentos viales que resulten seleccionados para ser intervenidos mediante la modalidad de construcción, esto siempre y cuando cumplan con todos los criterios técnicos, jurídicos, administrativos, ambientales y legales.

Posteriormente estos tramos viales serán incluidos en los procesos de construcción que se llevarán a cabo con los recursos de las vigencias 2020 en adelante hasta cumplir con la totalidad de estos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


TRAMOS RELEVANTES

CRA 92 ENTRE CALLE 147 B Y CALLE 148



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

CRA 98 B ENTRE 139 Y CALLE 145

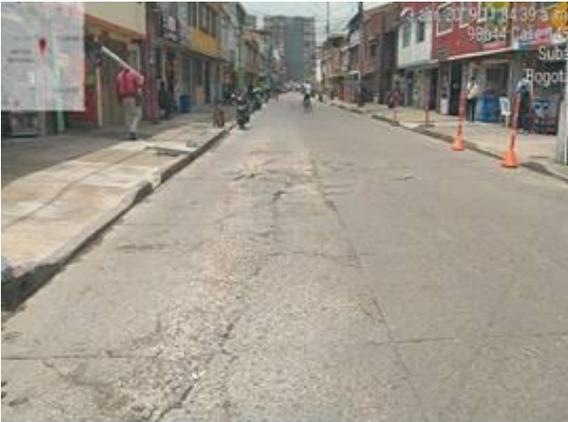

CRA 101 ENTRE CALLE 148 Y CALLE 150 A



Pilar 3. Construcción de comunidad.

Seguridad y convivencia

Proyecto 1469 Suba segura y mejor para todos. Para el proyecto de seguridad en dotaciones tecnológicas, en convenio con la secretaria de seguridad, logramos el cumplimiento de la meta plan en mayores proporciones a lo esperado, dotando con más de 300 cámaras, 8 vehículos tipo panel y mas de 150 motocicletas para la localidad, así como también 1 vehículos tipo CAI móvil.

Eje transversal. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia energética.

Ambiente



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Proyecto 1466: Suba aprovecha integralmente los residuos. En la implementación de las acciones y procesos para recolección de residuos, consideramos de la mayor importancia la concertación con las asociaciones de recicladores de la localidad para unificar los procesos y la forma en que se relacionan con los recicladores, la compra y aprovechamiento de los materiales recolectados y la identificación de las personas que reciclan en la calle, así como las rutas de reciclaje. Se desarrolló a través de una estrategia exitosa de Vigías ambientales, que contaban con el conocimiento y la experiencia para brindar y abrir los espacios al cumplimiento de las normas y converger para una mejor alianza entre las asociaciones y los recicladores.

Proyecto 1472 más árboles y mejor calidad del aire en Suba. Para los proyectos relacionados con el tema ambiental alcanzamos el 100% de lo esperado en cada vigencia con arborización, renaturalización y ecurbanismo, se sembraron más de 900 árboles en las vigencias 2018 y 2019, en cuidados podas e intervención un total de 4061 árboles y cerca de 10 metros cuadrados de renaturalización y ecurbanismo, así como también actividades de restauración y recuperación de la ronda del río Bogotá y los humedales propios de la localidad, contribuyendo a una mejor calidad de vida de los habitantes.

Proyecto 1476 Suba promueve el desarrollo rural sostenible. El componente de ruralidad fue uno de los retos y logros alcanzados en la localidad para la vigencia 2019, pues se realizó un trabajo participativo para lograr concurrir las diferentes asociaciones y beneficiarios de asistencias técnicas y emprendimientos rurales, cuyos compromisos quedaron establecidos y en ejecución para el cumplimiento del 100% de la meta establecida en el plan de desarrollo local, ahora bien, con los recursos destinados en el POAI 2020, se superaría la meta programada.

Eje transversal. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia.

Proyecto 1481: Suba comprometida con la inspección la vigilancia y el control. Se logró el cumplimiento de la meta establecida en el plan de desarrollo, a través de las acciones de mejoramiento de espacio público, las actividades encaminadas al cumplimiento de la norma en los establecimientos de comercio, acciones pedagógicas, actividades realizadas por los inspectores y además todas las gestiones establecidas para la inspección vigilancia y control con la que cuenta la alcaldía local, así también se logró cerrar expedientes de acciones judiciales y celeridad en los procesos.

Participación

Proyecto 1483: Suba se expresa y decide. El Proyecto cuenta con dos metas, la primera corresponde a fortalecer 160 organizaciones o instancias de participación en la que alcanzamos más del 75% en ejecución de la meta programada. Este avance se ha logrado a través de las dotaciones, adecuaciones y de mas acciones realizadas con la JAC de la localidad. Adicionalmente para la vigencia 2019 se realizaron los compromisos contractuales para la implementación de la estrategia 1+ 1 todos 1+1 todas, la cual benefició más de 60 instancias de participación legalmente constituidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.


5.1 TERRITORIALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

La georreferenciación de las inversiones realizadas, inicialmente en malla vial, parques, dotación a jardines infantiles e instituciones educativas, salones comunales y escuelas de formación artística, contribuye al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de las intervenciones adelantadas por las alcaldías locales, al considerar una perspectiva que pone en contexto territorial los productos contratados y entregados a través de los FDL.

De igual manera permite ir construyendo una cultura que, en lo institucional, obliga a pensar la planeación de la inversión más allá de presupuestos, metas y cifras crudas y, en lo participativo, facilita la identificación de la localización de dichas inversiones, así como el control ciudadano sobre las mismas.



Mapa No. 1. Territorialización Alcaldía Local de Suba.

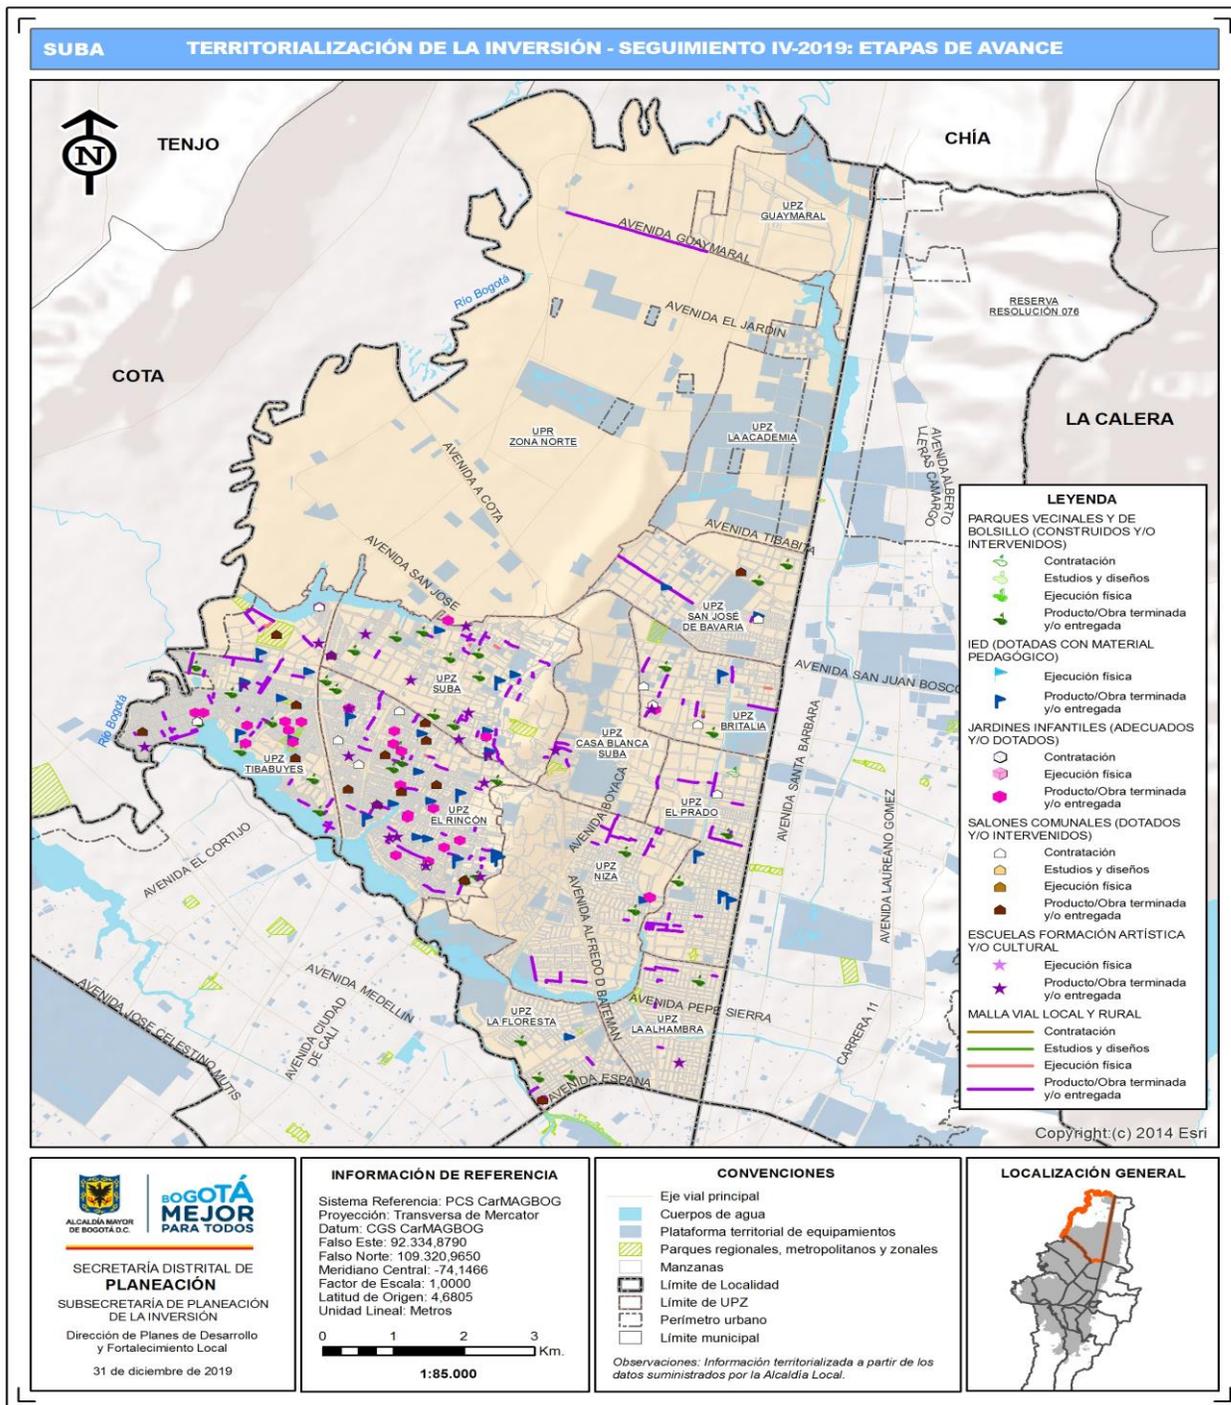

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Malla vial

Tabla No. 12. Territorialización malla vial local.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008385	CL 129 D entre KR 85 y KR 86 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008210	CL 141 entre KR 46 y KR 47	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008054	CL 141 entre KR 53 y KR 52	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007027	CL 147 A entre KR 48 y KR 49	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006296	CL 151 entre KR 55 y KR 54B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008003	KR 49 entre CL 144 y CL 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011709	KR 53 entre CL 144 A y CL 145	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007714	KR 53 entre CL 144 y CL 144 A	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006688	KR 54 entre CL 149 y CL 150	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006547	KR 54 entre CL 150 y CL 150 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006394	KR 54 entre CL 150 A y CL 151	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010175	KR 54 B entre CL 127 D y CL 127 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010142	KR 54 B entre CL 127 D BIS y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011241	CL 106 entre KR 52 y KR 53	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010810	KR 53 A entre CL 116 y CL 118	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005226	CL 146 F entre KR 78 B y KR 78 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005257	CL 146 F entre KR 78 A y KR 78	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011907	CL 146 F entre KR 80 y KR 78 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005363	CL 146 F entre KR 76 y KR 78	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005194	CL 147 entre KR 80 y KR 78	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005731	KR 76 entre CL 146 A y CL 146 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005828	KR 76 entre Av. Tv Suba y CL 146 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006504	KR 76 entre CL 145 A y CL 145 B	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005193	KR 80 entre CL 146 F y CL 146 F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003483	KR 80 entre CL 146 A y CL 146 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005454	KR 80 entre CL 146 B BIS y CL 146 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005286	KR 80 entre CL 146 F y CL 146 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005136	KR 80 entre CL 146 F BIS y CL 147	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50007331	KR 80 entre CL 146 A y CL 146 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	30001385	CL 152 entre KR 58C y KR 59	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010613	CL 119 entre KR 70 G y KR 71 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010621	CL 119 entre KR 70 C y KR 70	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008032	CL 135 entre KR 58 B y KR 58 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008087	CL 135 entre KR 58 A y KR 58 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008030	CL 135 entre KR 58 C y KR 59 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008098	CL 135 A entre KR 58 A y KR 58	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008237	CL 136 entre KR 57 y KR 56 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50007335	CL 137 A entre KR 58 y KR 58 BIS	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007932	CL 137 B entre KR 57 y KR 56 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007931	KR 56 A entre CL 137 B y CL 138	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008522	KR 57 entre CL 134 y CL 134 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007883	KR 57 entre CL 138 y CL 137 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008192	KR 57 entre CL 137 y CL 136	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008391	KR 57 entre CL 136 y CL 134 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008086	KR 58 A entre CL 135 y CL 135 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011696	KR 59 A entre CL 136 y CL 135	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011697	KR 59 A entre CL 134 y CL 135	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007825	KR 59 A entre CL 136 y CL 138	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010612	KR 70 G entre CL 119 y CL 119	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010570	KR 70 G entre CL 119 A y CL 119 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007871	KR 118 D entre CL 126 B y CERRAMIEN	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011933	KR 70 G entre CL 119 y CL 119 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011935	KR 70 G entre CL 119 A y CL 120	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010624	KR 71 A entre CL 118 y CL 119	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010551	KR 71 D entre CL 119 A y CL 120	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010596	KR 71 D entre CL 118 y CL 119 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50007227	KR 71 D entre CL 126 y CL 127	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010520	KR 71 D entre CL 120 y CL 121	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50007228	KR 71 D entre CL 124 y CL 126	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010451	KR 71 D entre CL 122 y CL 124	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007826	CL 136 entre KR 59 A y KR 72	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007822	KR 118 D entre CL 126 B y CL 126 B BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011913	CL 103 entre KR 69 y KR 69	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011368	CL 103 entre KR 68 A y KR 69	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011662	KR 68 B entre CL 94 y CL 94 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011664	KR 68 B entre CL 93 A y CL 94	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011607	KR 69 entre CL 94 A y CL 95	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011614	KR 69 entre CL 94 y CL 94 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011628	KR 69 entre CL 93 A y CL 94	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003527	CL 146 entre KR 81 BIS y KR 81 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003525	CL 146 entre KR 81 A y KR 81 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50007346	CL 146 entre KR 81 B y KR 82 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007775	KR 118 D entre CL 126 B BIS y CL 126 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003479	CL 146 entre CL 146 A y KR 81 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003916	CL 147 B entre KR 96 y KR 97	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001141	CL 157 entre KR 98 y KR 97 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001842	CL 157 entre KR 90 y KR 89	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001304	CL 157 A entre KR 95 y KR 96	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001441	CL 157 A entre KR 92 y KR 93 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012949	CL DG 155 A entre KR 88 y KR 89	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002489	KR 90 entre CL 152 A y CL 152 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013192	KR 90 entre CL 152 y CL 152 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007664	KR 118 D entre CL 126 D y CL 126 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002269	KR 90 entre CL 154 y CL 154 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002710	KR 90 entre CL 152 A y CL 152	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004675	KR 90 entre CL 147 y CL 147 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005108	KR 90 entre CL 146 B y CL 146 C BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002297	KR 90 entre CL 154 y CL 153 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003870	KR 97 entre CL 147 B y CL 147 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004084	KR 97 entre CL 147 y CL 147 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001271	KR 98 entre CL 156 A y CL 156 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001344	KR 98 entre CL 155 D y CL 156 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001234	KR 98 entre CL 156 B y CL 156 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11011965	KR 118 D entre CL 126 D y CL 126 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001170	KR 98 entre CL 156 C y CL 157	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001094	KR 98 entre CL 157 y CL 157 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005392	TV 88 entre CL 145 A BIS y CL 146 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005719	TV 88 entre CL 145 y CL 145 A BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11009407	CL 127 B entre KR 91 B y KR 91 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11009440	CL 127 B entre KR 91 A y KR 91 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11009500	CL 127 B entre KR 91 y KR 91 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008163	CL 128 A entre KR 96 y KR 96 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007854	CL 128 F entre KR 96 A y KR 98 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007939	CL 130 entre KR 92 A y KR 93	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008374	CL 129 D entre KR 86 A y KR 87	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11011966	KR 118 D entre CL 126 D BIS y CL 126 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012057	CL 130 entre KR 92 BIS y KR 92 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008001	CL 130 entre KR 91 y KR 92	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007777	CL 130 B entre KR 92 y KR 92 BIS	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007755	CL 130 B entre KR 92 BIS y KR 92 A	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007800	CL 130 B entre KR 91 y KR 92	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006501	CL 131 C entre KR 98 C y KR 99	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006503	CL 131 C entre KR 99 A y TV 100 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011734	CL 131 C entre KR 99 y KR 99 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007612	KR 118 D entre CL 126 D BIS y CL 126 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006509	CL 131 C entre KR 98 B y KR 98 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006539	CL 131 C entre KR 98 A y KR 98 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005786	CL 134 A entre KR 100 A y KR 101 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005706	CL 134 A entre KR 101 B y KR 102 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011823	CL 135 entre KR 90 y KR 91	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012563	CL 136 entre KR 95 D y KR 96	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005935	CL 136 entre KR 95 A y KR 95 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005917	CL 136 entre KR 95 B y KR 95 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CV	Etiqueta vial	Escala	Etapa avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004848	CL 137 entre KR 106 BIS y KR 107	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11005552	CL 137A entre CR 98B y CR 98C	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007768	CL 126 C entre KR 118 A y KR 118 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005579	CL 137 A entre KR 98 y KR 98 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005624	KR 100 BIS entre CL 136 y CL 136 BIS A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005615	KR 101 A entre CL 135 A y CL 136	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003778	KR 102 A entre CL 142 y CL 145	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004029	KR 102 A entre CL 141 y CL 141 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003893	KR 102 A entre CL 141 B y CL 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007359	KR 102 A entre CL 129 C y CL 129 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007713	CL 126 C entre KR 118 D y KR 119	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003358	KR 107 entre CL 141 A y CL 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002797	KR 107 entre CL 143 y CL 145	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002915	KR 107 entre CL 142 A y CL 142 A BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004376	KR 107 entre CL 139 y CL 140 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007834	KR 88A entre CL 130 D y CL 131	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007099	CL 130 entre KR 100 C y KR 101	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007130	CL 130 entre KR 100 B y KR 100 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007172	CL 130 entre KR 100 A y KR 100 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007016	CL 128 entre KR 121 B y KR 121 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013128	TV 141 A BIS entre DG 150 y DG 151	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007050	CL 128 entre KR 121 A y KR 121 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006906	CL 128 entre KR 121 F y KR 122	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006991	CL 128 entre KR 121 C y KR 121 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006942	CL 128 entre KR 121 D y KR 121 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005274	CL 131 A entre KR 158 C y KR 159	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004784	CL 131 A entre KR 154 y KR 154 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004040	CL 132 F entre KR 129 y KR 131	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002169	CL 143 A entre KR 127 C y KR 127 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002291	CL 143 A entre KR 127 D y KR 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013141	CL 144 entre KR 147 y KR 147 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013129	TV 141 A BIS entre DG 151 y DG 150	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012823	CL 144 entre KR 143 A y KR 144	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012981	CL 144 entre KR 141 A BIS y KR 141 A B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013142	CL 144 entre KR 146 A y KR 147	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012824	CL 144 entre KR 143 A y KR 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012821	CL 144 entre KR 145 A y KR 145 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012820	CL 144 entre KR 141 A BIS A y KR 141 A B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013143	CL 144 entre KR 146 A y KR 145 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012826	CL 144 entre KR 145 B y KR 145 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012825	CL 144 entre KR 142 y KR 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012828	CL 144 entre KR 144 y KR 145	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013117	DG 151 entre TV 141 A BIS y TV 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012822	CL 144 entre KR 145 y KR 145 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012817	CL 144 entre KR 141 B y KR 141 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012819	CL 144 entre KR 141 A BIS B y KR 141 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012816	CL 144 entre KR 141 C y KR 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012818	CL 144 entre KR 141 A BIS C y KR 141 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012980	CL 144 entre KR 147 C y KR 147 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013467	DG 146 entre KR 136 A y KR 136 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007214	KR 120 A entre CL 127 y DG 128 A BIS	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004162	KR 131 entre CL 132 C y CL 132 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013116	DG 151 entre TV 141 A BIS y TV 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004344	KR 131 entre CL 132 B y CL 132 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004689	KR 131 entre CL 132 y CL 132 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011851	KR 136 A entre CL 144 y CL 144 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002220	KR 136 A entre CL 143 y CL 143 A	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002553	KR 136 A entre CL 142 C BIS y CL 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002026	KR 136 A entre CL 143 A y CL 144	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013186	KR 136 A entre CL 142 y CL 142 C BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11011975	KR 119 D entre CL 128 C y CL 128 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007076	KR 119 D entre CL 128 C y CL 128 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007039	KR 119 D entre CL 128 C BIS y CL 128 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	50009476	KR 86 B entre CL 129 y CL 129 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11006999	KR 119 D entre CL 128 D y CL 128 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11006935	KR 119 D entre CL 128 D BIS y CL 128 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11006874	KR 119 D entre CL 128 F y CL 129	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11005317	CL 135 A entre KR 104 y KR 105 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11005261	CL 135 A entre KR 105 C y KR 106	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11005229	CL 135 A entre KR 106 y KR 107	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11005192	CL 135 A entre KR 107 y KR 107 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11003972	CL 147 B entre KR 95 A y KR 96	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11003971	KR 95 A entre CL 147 B y CL 147 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11003746	KR 64 entre CL 160 y CL 160 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	50009473	CL 129 BIS entre KR 86 A y KR 86 A BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010511	CL 125 entre KR 52 A y KR 53	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010505	CL 125 entre KR 53 y KR 53 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010497	CL 125 entre KR 53 A y KR 54	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008182	CL 133 entre KR 59 B BIS y KR 59 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008164	CL 133 entre KR 59 C y KR 59 C BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009942	CL 128 B entre KR 50 y KR 50 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009939	CL 128 B entre KR 50 A y KR 51	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008673	CL 128 B entre KR 93 y KR 93A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010097	CL 128 entre KR 53 D y KR 54	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010101	CL 128 entre KR 53 C y KR 53 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013120	TV 142 entre DG 151 y DG 150	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	50009474	CL 129 BIS entre KR 86 A BIS y KR 86 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010614	KR 53 B entre CL 122 A y CL 123	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010591	CL 123 entre KR 53 B y KR 53 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010556	CL 125 entre KR 45 A y KR 46	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010509	CL 124 A entre KR 54 y KR 54 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010515	CL 124 A entre KR 54 A y KR 54 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008566	CL 128 B entre KR 93 C y KR 93 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11002070	KR 151 B entre CL 142 B y CL 142 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013127	TV 141 A BIS entre DG 150 y DG 147	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000332	CL 175 entre KR 67 y KR 67	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000289	CL 175 entre KR 70 y KR 71	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000307	CL 175 entre KR 68 y KR 69	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000182	CL 175 entre KR 79 y KR 80	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000200	CL 175 entre KR 78 y KR 79	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000206	CL 175 entre KR 77 y KR 78	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001924	KR 151 B entre CL 142 C y CL 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000226	CL 175 entre KR 76 y KR 77	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000245	CL 175 entre KR 74 y KR 76	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000263	CL 175 entre KR 72 y KR 74	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000622	KR 52 A entre CL 176 y CL 178	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003199	CL 163 B entre KR 49 y KR 50	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003143	CL 163 B entre KR 54 y KR 50	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010011	CL 128 entre KR 56 C y KR 56 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007299	CL 129 entre KR 103 y KR 104 (Av. Cali)	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007314	CL 129 entre KR 102 A y KR 103	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007083	CL 129 entre KR 104 D BIS y KR 104 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001750	KR 151 B entre CL 143 y CL 143 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007114	CL 129 entre KR 104 D y KR 104 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007147	CL 129 entre KR 104 C y KR 104 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007181	CL 129 entre KR 104 B y KR 104 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11007075	CL 130 entre KR 101 y KR 101 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004473	CL 131 A entre KR 151 A y KR 152	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11005852	CL 136 entre KR 96 y KR 96 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11012421	CL 151 entre KR 55 y KR 56	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	30001386	CL 152 entre KR 58 y KR 58 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001407	CL 157 A entre KR 93 A y KR 95	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000277	CL 175 entre KR 71 y KR 72	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001608	KR 151 B entre CL 143 B y CL 144	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000299	CL 175 entre KR 69 y KR 70	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000318	CL 175 entre KR 68 y KR 68	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11000344	CL 175 entre KR 65 y KR 67	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001392	DG 146 entre KR 128 y KR 136 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003494	KR 111 A entre CL 151 C y CL 151 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11006376	KR 123 C entre DG 129 y CL 128 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003493	KR 141 A entre CL 132 D y CL 134	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002770	KR 148 entre DG 138 F y CL 139	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003045	KR 148 B entre CL 137 y DG 138 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003630	KR 154 A BIS entre CL 137 B y CL 138	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11002148	KR 150 entre CL 142 C y CL 142 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003716	KR 154 A BIS entre CL 137 A y CL 137 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003793	KR 154 A BIS entre CL 137 y CL 137 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003890	KR 154 A BIS entre CL 136 A y CL 137	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11004637	KR 159 entre CL 135 y CL 136	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	50003484	KR 158 BIS entre CL 137 A y CL 138	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11011660	KR 68 B entre CL 94 A y CL 95	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010489	KR 71 D entre CL 121 y CL 122	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010513	CL 125 entre KR 52 y KR 52 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007880	KR 53 entre CL 143 y CL 144 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008010	KR 53 entre CL 141 y CL 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001768	KR 145 C entre CL 143 B y CL 144	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001829	KR 145 C entre CL 143 A y CL 143 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012830	KR 138 A entre CL 142 BIS A y CL 142 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11013133	DG 147 entre TRV 141 B BIS y TRV 141	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11013067	TRV 141 B BIS entre DG 147 y DG 149	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11013068	DG 149 entre TV 141 B BIS y TV 142	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012831	KR 138 A entre CL 142 A y CL 142 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11002750	KR 62 entre CL 163 y CL 164	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11002548	KR 62 entre CL 164 y CL 167	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008289	CL 128 B entre TV 94 y KR 95	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012043	CL 128 B entre KR 95 y KR 95 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010075	CL 128 entre KR 54 C y KR 55	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010079	CL 128 entre KR 54 B y KR 54 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010089	CL 128 entre KR 54 y KR 54 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008576	CL 129 entre KR 89 y KR 89 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008559	CL 129 entre KR 89 BIS y KR 89 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013121	TV 142 entre DG 150 y DG 151	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012832	KR 138 A entre CL 142 B y CL 142 B BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008538	CL 129 entre KR 89 BIS y KR 91	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008505	CL 128 B entre CKR 93 C y KR 93 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008438	CL 128 B entre KR 93 D y TV 94	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012833	KR 138 A entre CL 142 B BIS y CL 142 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007711	KR 118 D entre CL 126 C y CL 126 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11001457	CALLE 156 C entre CRA 96 y CRA 96 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11014037	CL 146 entre KR 81 y CL 146 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012370	CL 151 entre KR 54 y KR 54 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009992	KR 53 C entre CL 128 A y CL 128 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010192	KR 53 C entre CL 127 D y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009526	CL 127 B entre KR 89 y KR 89	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012834	KR 138 A entre CL 142 C y CL 142 C BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009518	CL 127 B entre KR 90 C y KR 90 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009524	CL 127 B entre KR 89 y KR 90 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009507	CL 127 B entre KR 90 C y KR 91	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013377	KR 99B entre CL 156 C y CL 156	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013594	KR 87 D entre CL 129 y CL 129 A BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013595	CL 129 entre KR 87 D y KR 87 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004704	KR 94 entre CLL 146C y CLL 146 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004556	CL 131 entre KR 151 A y KR 152	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004659	CL 131 entre KR 152 y KR 153	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004767	CL 131 entre KR 153 y KR 154	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012844	KR 138 A entre CL 142 C BIS y CL 142 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004829	CL 131 entre KR 154 y KR 154B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004869	CL 131 entre KR 154B y KR 154C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012506	CRA 58 entre CL 151 y CL147	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013836	CL 235 entre N/A y N/A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013835	CL 235 entre N/A y N/A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11014022	CL 235 entre N/A y N/A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada



Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	CIV	Etiqueta vial	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11013834	AV. CL 235 entre DG 235 A y A.Puerto C	Rural	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012845	KR 138 A entre CL 142 D y CL 142 F	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012846	KR 138 A entre CL 142 F y CL 142 F BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11002892	KR 88 entre CL 152 y CL 152 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009556	KR 87 D entre CL 127 C y CL 127 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11009474	KR 87 D entre CL 127 D BIS y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007324	KR 119 C entre CL 127 y KR 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11008905	KR 86 A BIS entre CL 128 C BIS y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001103	CL 154 A entre KR 106 A y KR 105	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001116	CL 154 A entre KR 105 y KR 104	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004439	KR 154 A BIS entre CL 132 D y CL 132 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004520	KR 154 A BIS entre CL 132 A y CL 132 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004438	CL 132 A entre KR 154 A BIS y KR 154	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012883	CL 142 C entre KR 138 A y KR 139	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010123	KR 54 C entre CL 127 D y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012847	KR 138 A entre CL 142 F BIS y CL 143	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010172	KR 55 entre CL 127 D y CL 127 D BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11010135	KR 55 entre CL 127 D BIS y CL 128	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001559	CL 154 entre KR 99 y KR 100	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001497	KR 100 entre CL 154 y CL 154A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001219	CL 156 entre KR 99 y KR 99A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013376	CL 156 entre KR 99A y KR 100	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001144	CL 156 entre KR 100 y KR 101	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001227	KR 100 entre CL 155 C y CL 156	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11012027	KR 100 entre CL 156 y CL 156 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11001095	KR 100 entre CL 156 B y CL 156 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11007619	CL 126 D BIS entre KR 118 D y KR 119	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	50008927	KR 57 entre CL 160 y CL 162	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	50008929	KR 57 entre CL 162 y CL 162 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013279	KR 57 entre CL 162 A y CL 162 A BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013280	KR 57 entre CL 162 A BIS y CL 162 B	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11013281	KR 57 entre CL 162 B y CL 163	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004643	CRA 156 entre CLL 132 D y CLL 132 BIS	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2016	11004698	CRA 156 entre CLL 132 BIS y CLL 132	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003386	CL 163 B entre KR 46 y KR 48	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003291	CL 163 B entre KR 48 y KR 49	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003482	CL 163 B entre KR 45 y KR 46	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11002423	CL 167 entre KR 46 y KR 48	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002274	KR 54 entre CL 168 A y CL 167	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11001997	KR 54 entre CL 168 A y CL 169	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2019	11003682	KR 55 entre CL 161ABIS y CL 162	Local	Contratación
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003772	KR 55 entre CL 161 A y CL 161 A Bis	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003728	KR 55 C entre CL 162 y CL 161 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11003427	KR 55 C entre CL 162 y CL 163	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11002011	KR 67 entre CL 167 y CL 168	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2018	11011726	CRA 99 A entre CL 155 y CL 155 A	Local	Ejecución física
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010214	CL 127 D entre KR 53 y KR 52 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010187	CL 127 D entre KR 54 y KR 53 D	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010193	CL 127 D entre KR 53 D y KR 53 C	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010211	CL 127 D entre KR 53 A y KR 53	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010200	CL 127 D entre KR 53 C y KR 53 A	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010125	CL 128 entre KR 53 A y KR 53	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11010115	CL 128 entre KR 53 A y KR 53 C	Local	Obra reportada y no ejecutada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008094	CL 141 entre KR 50 y KR 52	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008133	CL 141 entre KR 50 y KR 49	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1506-00	Km/carril de malla vial local/rural	2017	11008168	CL 141 entre KR 47 y KR 49	Local	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Parques

Tabla No. 13. Territorialización parques.

Código proyecto	Vigencia	Nombre parque	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 CAFAM		KR 113C 142A 53	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 LA TOSCANA		CL 133 127 21	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 BERLIN		CL 139 145 84	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 POTRERILLOS		KR 102A 133 20	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 COSTA AZUL I Y II		CL 138 102 99	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 PINAR DE SUBA		KR 96A 152 20	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 DESARROLLO BILBAO		CL 143 150D 15	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 NUEVA TIBABUYES		CL 129D 122 60	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 LISBOA		KR 151A 132A 16	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 PRADO PINZON		CL 143 49 38	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 PORTALES DEL NORTE		CL 168 62 47	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 FLORESTA NORTE		KR 68D 98A 40	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2019 URBANIZACIÓN MAZUREN I SECTOR		KR 50 152 35	VECINAL	Contratación
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 JORDAN		KR 87D 128 68	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 LA ALBORADA		CL 96 69B 29	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 CIUDAD HUNZA		KR 86B 128 75	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 VILLAS TERCER SECTOR		KR 56 128B 01	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2014 EL BATAN		KR 50 123A 30	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 POTRERILLOS		CL 135 101A 05	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 URBANIZACION MIRANDELA		KR 46 187 47	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 PORTAL DE LAS MERCEDES		KR 111A 152G 64	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 CAMPANELA		KR 97B 153 95	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 CAFAM		CL 143A 113C 80	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 MIRAMAR		CL 129B 130 28	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 ATENAS		CL 128 119F 05	BOLSILLO	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 SAN PEDRO		KR 88 136 68	BOLSILLO	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 URBANIZACION GRANADA		AK 58 133 35	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 POTOSI		CL 98 71 49	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 VIVIENDA LA SULTANA		KR 53C 131A 04	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 VILLANOVA		KR 54D 183 91	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 RINCON DE LA CAMPIÑA		KR 97 146D 11	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 LAS FLORES		KR 115 150C 20	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 LA NAVETA		CL 147 100 50	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 ENCONCLAVOS		KR 106A 153A 11	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 PRADERA DE SUBA		AC 153 101 81	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-17-1465-00	2017 SOTAVENTO		CL 162 54 55	VECINAL	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardines infantiles

Tabla No. 14. Territorialización Jardines Infantiles

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Dirección	Etapa avance
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	91166208	CL 129 55 05/02	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92022518	CL 129 B 91B 13/05	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92571430	CL 130 A 129 53	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92237402	CL 130 B 96 57	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92237404	CL 130 B 96 57	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92057407	CL 131C 100 44	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92161423	CL 133 BIS 126 37	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92540606	CL 135 151 50	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92080504	CL 137 A BIS 103 22	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92120901	CL 146 C BIS 91 42	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	91142219	CL 161 A 59 69	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92081608	CL136 A 101 B 32	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92112420	KR 103 C 139 53	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92166432	KR 126 BIS 135 B 43	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92295230	KR 136 132A 38	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92430333	KRA 103 159 49	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2017	92162515	TV 126 F 133 76	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92377045	CL 127 F 94 53 KR 93 F 127 B 46	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92027209	CL 128 A BIS A No 92-72	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92018227	CL 130 89 09	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92161423	CL 133 BIS 126 37	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92541951	CL 134 A 150 B 03	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92031802	CL 140 A 111 B 30	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	0	KR 118 141 55	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92570202	KR 125 B 132 B 51	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	54039002	KR 68 B 94 A 98	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2018	92233501	KR 94 D 131 03	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	0	CL 144 139 55	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	0	CL 144 139 55	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	0	KR 91 129A 10	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	92237402	CL 130 B 96 57	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	92343801	KR 136 C 152F 44	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	92120901	CL 146 C BIS 91 42	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	92057407	CL 131C 100 44	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1426-00	2019	91166202	CL 129 55 05	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Salones comunales

Tabla No. 15. Territorialización Salones comunales.

Código proyecto	Indicador georreferenciable	Vigencia	Nombre Salón	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Río Bamba (11073)	KR 95 B 133 25	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Tibabuyes Universal (11100)	CL 139 127 08	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Urbanización Santa Cecilia (11115)	KR 158 B 135 A 45	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Costa Azul (11017)	CARRERA 103F CALLE 135 32	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Julio Flórez (11039)	KR 68 B 94 12	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Jordán (11023)	KR 87 D 128 68	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Guicani (11033)	CL185 56 01	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Antonio Granados (11004)	KR 99B 139 98	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Lagos De Suba (11139)	KR 102 A 129 D 40	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Aures I (11006)	CL 131 A 100 24	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Aures II (11007)	CARRERA 105 B 129 D 92	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Cañiza Tibabuyes (11041)	TV 124 A 130 F 03	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	El Pórtico (11026)	CL 141 A 99 B 02	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Rincon De Santa Inés Compartir 5 Etapa (11192)	CL 149 117 35	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2017	Fontana (11140)	CL 147 A 140 09	Vecinal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Urbanización Alcaparros De Suba (11001)	AC 132 105 B 00	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Cantalejo (11168)	KR 55C 160 24	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Urbanización El Poa (11024)	KR 103 C BIS 141 B 71	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Urbanización Gilmar (11108)	KR 62 161 C 33	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Lisboa (11090)	KR 151 A 132 A 16	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Urbanización Nueva Zelandia (11060)	CL 181 51 A 31	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Suba Compartir I Etapa (11200)	KR 136 C 152 F 44	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	La Victoria Norte (11047)	CL 150 53 91	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Villa Delia Norte (11119)	CL 164 B 65 23	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	El Rubí (11028)	CL128 BIS 92 B 12	Vecinal	Contratación
3-3-1-15-02-18-1483-00	Salones comunales intervenidos	2018	Villa María II Sector	KR 111 135 05	Vecinal	Contratación

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Instituciones Educativas Distritales

Tabla No. 16. Territorialización Instituciones Educativas Distritales.

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre IED	Dirección	Escala	Etapas avance
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91067001 <Null>		KR 53 135 13	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92211402 <Null>		CL 133 98B 24	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92233625 VIRGINIA GUTIERREZ DE PINEDA		CL 131B 94F 31	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92630421 <Null>		KR 84 129A 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92350218 <Null>		CL 130 88 B 20	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92570202 LA GAITANA		TV 126 134 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92521606 <Null>		KR 143 142 A 62	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92123037 <Null>		KR 92 152A 52	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92444201 <Null>		KR 103B 153 1	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92077720 <Null>		CL 132 92 71	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	0 <Null>		CL 132 114 43	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92102801 <Null>		CL 140 100 30	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91172601 Colegio Gustavo Morales		CL 129 55 55	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92122637 <Null>		KR 90 145 39	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92034005 Colegio Alberto Uleras Camargo		KR 111 A 139 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91076923 <Null>		CL130 45 71	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	92480104 Delia Zapata Olivella		CL144 C 141 A 51	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91074419 Colegio Prado Veraniego		KR 46 130 65	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91026902 <Null>		CL 167A 54B 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2017	91132504 <Null>		KR 70 173A 90	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	0 Colegio La Toscana - Lisboa		CL 133 131 45	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92034005 Colegio Alberto Uleras Camargo		KR 111 A 139 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92102801 Colegio Juan Lozano Y Lozano		CL 140 100 30	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	0 Colegio Nicolás Buenaventura		KM 7 VIA SUBA - COTA	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	0 Colegio El Salitre- Suba		CL 163 92 96	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	91204001 Colegio Nueva Zelandia (Mirandela)		CL 181 51A 31	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92278601 Colegio Nueva Colombia		KR 102A 128 A 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92023607 Colegio Ramón de Subiría		DG 129 B BIS 93 B 51	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	91172601 Colegio Gustavo Morales		CL 129 55 55	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	91074419 Colegio Prado Veraniego		KR 46 130 65	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	54022804 Instituto Tecnico Distrital Julio Florez		CL 102 A 70 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92639101 Colegio Hunza		KR 84 A 129 A BIS 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92301601 Gerardo Paredes		KR 94 C 129 A 04	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92444201 Nicolas Buenaventura		KR 103 B 153 1	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92206102 Álvaro Gómez Hurtado		KR 100 A 130 18	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92570202 La Gaitana		TV 126 134 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92570133 La Toscana - Lisboa		CL 132 133 A 43	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92327401 Bilbao		CL 143A 118 50	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92480104 Delia Zapata Olivella		CL 144 C 141 A 51	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	91026902 Vista Bella		CL 167 A 54 B 4	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92144801 Veintiún Ángeles		KR 90 154 A 09	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92120911 Filarmónico Simón Bolívar		KR 91 146 C 63	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92233625 Virginia Gutiérrez De Pineda		CL 131B 94F 31	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	0 República Dominicana		CL 131A 125 43	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	0 Sabana Tibabuyes - Colegio La Toscana Lisboa		CL 133 131 45	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2018	92254602 Colegio Tibabuyes Universal		KR 128 A 139 13	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	0 Colegio La Toscana - Lisboa		CL 133 131 45	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92034005 Colegio Alberto Uleras Camargo		KR 111 A 139 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92102801 Colegio Juan Lozano Y Lozano		CL 140 100 30	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92444201 Colegio Nicolás Buenaventura		KR 103 B 153 1	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	0 Colegio El Salitre- Suba		CL 163 92 96	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	91204001 Colegio Nueva Zelandia (Mirandela)		CL 181 51A 31	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92278601 Colegio Nueva Colombia		KR 102A 128 A 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92023607 Colegio Ramón De Subiría		DG 129 B BIS 93 B 51	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	91172601 Colegio Gustavo Morales		CL 129 55 55	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	91074419 Colegio Prado Veraniego		KR 46 130 65	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	54022804 Instituto Técnico Distrital Julio Flórez		CL 102 A 70 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92639101 Colegio Hunza		KR 84 A 129 A BIS 40	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92301601 Gerardo Paredes		KR 94 C 129 A 04	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92206102 Álvaro Gómez Hurtado		KR 100 A 130 18	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92570202 La Gaitana		TV 126 134 88	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92570133 La Toscana - Lisboa		CL 132 133 A 43	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92327401 Bilbao		CL 143A 118 50	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92480104 Delia Zapata Olivella		CL 144 C 141 A 51	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	91026902 Vista Bella		CL 167 A 54 B 4	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92144801 Veintiún Ángeles		KR 90 154 A 09	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92120911 Filarmónico Simón Bolívar		KR 91 146 C 63	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92102801 Colegio Juan Lozano y Lozano-Fontana Grande Lombardía		CL 140 100 30	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92233625 Virginia Gutiérrez De Pineda		CL 131B 94F 31	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	0 República Dominicana		CL 131A 125 43	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	0 Sabana Tibabuyes - Colegio La Toscana Lisboa		CL 133 131 45	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-02-18-1457-00	2019	92254602 Colegio Tibabuyes Universal		KR 128 A 139 13	Zonal	Producto/Obra terminada y/o entregada





Fuente: Visor territorialización MUSI

Escuelas de Formación Artística

Tabla No. 17. Territorialización Escuelas de Formación Artística

Código proyecto	Vigencia	Código lote	Nombre Lugar	Dirección	Etapas avance
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92220817	Casa de La Juventud "Diego Felipe Becerra"	CR 90 No. 135 b-23	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92348102	Salón Centro De Educación Popular Chipacuy	CALLE 146B #128-11	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92667049	JAC Rubí	CALLE 128 BIS NO 92 B - 12	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92521606	Colegio Gerardo Molina Ramírez.	Carrera 143 # 142A-62	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92134511	Edificio Sam 4 Piso	CALLE 150 A NO 103 C -74	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92337201	Salón Parroquial Almendros	Calle 152 b No. 114 b -13	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92567101	Salón Comunal Santa Cecilia	CARRERA 158 B No 131 a 45	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92031802	Salón Comunal Comuneros Norte	CALLE 140B No 111-35	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92581612	Salón Comunal Casa Blanca	CALLE 146D NO 79-35	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92099807	Salón Comunal Aures II	CALLE 133 No 107b-49	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92107954	Academia De Artes A.R.T. Bezaleel	CALLE 148 # 95-37	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92205901	Salón Comunal Lagos De Suba	CARRERA 102 A No 129 D 40	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92171801	Salón Comunal Compartir	CALLE 149 No 117 -35	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92122628	Casa De Igualdad Para Las Mujeres	CR 90 A #145-60	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92105812	Salón Comunal Java	CALLE 146 No. 95-58	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92440903	Liceo Técnico Bilingüe Paulo Freire	CARRERA 100 C # 158-56	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	91142816	Salón Comunal Gilmar	CARRERA 62 No. 161-33	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92301551	Salón Comunal Telecom-Arrayenes	CARRERA 96 No 128c -50	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	91260832	Centro Cultural Ato Arturo Vedregal	CARRERA 49 No 104a 25	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92352602	Casa De La Cultura Ciudad Hunza	CALLE 128 B # 86-20	Producto/Obra terminada y/o entregada
3-3-1-15-01-11-1459-00	2018	92302315	Casa De La Cultura Juvenil El Rincón	CALLE 128C # 96-57	Producto/Obra terminada y/o entregada

Fuente: Visor territorialización MUSI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

6. DIFICULTADES Y SOLUCIONES PROPUESTAS

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ÁREA DE PLANEACIÓN

No.	Dificultades	Descripción
1	Proyecto 1426: Primera infancia mejor para suba.	Se tenía programado la ejecución de la meta de Adecuar 6 Jardines Infantiles en la Localidad de Suba , sin embargo, debido a los tiempos establecidos en el Decreto 1082 de 2015 para desarrollar la licitación pública no era posible, por lo que se decidió que para la vigencia 2020 se dejaran los recursos disponibles en el POAI, con el propósito que la administración adelante lo concerniente y cumplir con 100% de lo establecido en el Plan.
2	Proyecto 1427: Suba Digna e Igualitaria.	El área de planeación se le dificulta la formulación y obtención de conceptos favorables conforme a la directiva 012, cuando los contratos del mismo proyecto no se encuentran anualizados y se demora su ejecución.
3	Proyecto 1461: Suba mejora integralmente sus barrios.	No se logró avanzar en la meta de este proyecto, debido a que el contratista seleccionado en la vigencia 2017 incumplió con el contrato, por lo que la meta se ve afectada y la población sin la regularización de su barrio.
4	Proyecto 1469: Suba Segura y Mejor Para Todos.	Para el proyecto de Seguridad se cuenta con una meta que corresponde a Construir y/o adquirir 3 CAI en La Localidad. Para la vigencia 2018 se logró adquirir uno de estos tres CAI; sin embargo, para la vigencia 2019 la policía metropolitana de Bogotá, a través de radicados a la alcaldía local, manifestó que para la operación no cuentan con el personal suficiente para la operación de un nuevo CAI móvil, es por ellos que no fue aprobado el anexo técnico presentado por la alcaldía para la adquisición de un CAI en la vigencia 2019. No obstante, la alcaldía local y los ediles manifestaron que se debe seguir dejando el recurso de esta meta que es prioritaria para la localidad, por lo tanto para la vigencia 2020 se dejan los recursos para la adquisición de un CAI y así cumplir con la meta restante.



5	<p>Proyecto 1481: Suba comprometida con la Inspección la vigilancia y el control.</p>	<p>Es importante adelantar las gestiones necesarias para la elaboración de los estudios previos y todos los procesos precontractuales, para garantizar el normal funcionamiento de las Inspecciones, actividades que se vienen desarrollando a través de un contrato de prestación de servicios de arrendamiento donde se ubicaron las 7 inspecciones de la localidad.</p> <p>La alcaldía solicitó concepto favorable a la Secretaría de Gobierno de Bogotá en el mes de enero de 2020, con el fin de cumplir con lo establecido en la directiva 012, para una adición de dos meses y que en ese periodo la administración entrante tome la determinación de si es pertinente el sitio o requieren uno nuevo diferente.</p>
---	---	---

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL ÁREA DE PLANEACIÓN

Tema	Importancia
Seguimiento al proyecto 1506: Hacia una movilidad sostenible.	Es necesario realizar la supervisión del contrato de estudios y diseños de malla vial, así como al de su interventoría. Esto con el fin de tener los productos e insumos fundamentales para la contratación de la construcción de malla vial de la localidad, el propósito es dar cumplimiento a la meta restante del cuatrienio.
Proyecto 1469 una suba segura y mejor para todos.	Es preciso mencionar que se deben adelantar las gestiones con la Secretaría de Seguridad y la MEBOG con el objeto de que den concepto técnico favorable para la adquisición de los CAI Móviles restantes que se encuentran en la meta del Plan de desarrollo.
Regularización de Barrios.	Se requiere adelantar verificación de lineamientos con la secretaria del Hábitat para y así dar cumplimiento a la normatividad y entrega de los soportes poder cumplir la meta de Regularización de barrios.
Continuación de la supervisión de los convenios con la Subred.	Se requiere coordinar con la Subred Norte los mecanismos necesarios para agilizar los tiempos de entrega de las ayudas técnicas a los beneficiarios y anualizar la inversión.
Adelantar supervisión de los procesos contratados en el último trimestre de la vigencia 2019.	Revisar los Estudios previos y anexos técnicos de los diferentes proyectos, con la finalidad de que se cumplan las condiciones y características establecidas para el desarrollo de las diferentes actividades.
Bolsa de precios o estudio de mercado global de la administración local.	Se sugiere respetuosamente adelantar un estudio de mercado general, para que, como base en la elaboración de los estudios previos de los procesos de la alcaldía, esta actividad debería desarrollarse en el primer bimestre de la vigencia 2020 y evitar el retraso en la contratación para la ejecución los proyectos.



Cumplir las metas programadas para la vigencia 2020.	Verificar que falta del plan de desarrollo y cumplir con todas ellas.
Cultura, recreación y deporte.	Para la vigencia 2020 se dejó elaborado el anexo técnico para el proyecto de Cultura, se recomienda realizar su revisión y proceder su ejecución en el primer trimestre del año.

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ÁREA CONTRATACIÓN

No.	Dificultades	Descripción
1	Plataforma SIPSE.	Fallas continuas en la plataforma SIPSE, haciendo que los procesos se retrasen.
2	Procedimiento Gobierno.	Trámites que exige la Directiva No. 012 de 2016, que redundan en trámites administrativos complejos.
3	Manual de procesos.	Falta de seguimiento y cumplimiento estricto de los manuales de procesos y procedimientos establecidos por la secretaria de gobierno, por falta de infraestructura y logística y cultura organizacional de los funcionarios y contratistas de FDLS.
4	Aplicativos de Apoyo.	Fallas continuas en el aplicativo Orfeo que generan dificultades para garantizar una efectiva entrega de la correspondencia que se expide.

SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL ÁREA CONTRATACIÓN

Tema	Importancia
PLATAFORMA SIPSE.	La plataforma operativa, ayuda a la recolección de datos e información, pero se evidencia falencias que atrasan los procesos, como lo es la generación de Actas de inicio, solicitudes de Registro Presupuestal, entre otras, es necesario que la secretaria de gobierno avance en mejorar las falencias en la plataforma.
COMODATOS.	Establecer el trámite que debe surtir en la plataforma transaccional SECOP I en relación con el cargue de Comodatos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local de Suba en vigencias anteriores desde 2018. Se hace necesario organizar la situación de la administración de la casa de la Cultura de Suba a través de un comodato y/o con la administración directa de la misma.
DIGITALIZACIÓN Y CUSTODIA DOCUMENTAL.	El manejo de la información física de los procesos contractuales en cada una de las modalidades requiere de un mayor número de personal en el Área de



	<p>Contratación. El manejo de la información física de los procesos contractuales de los expedientes contractuales requiere la digitalización y custodia documental adecuada para evitar la pérdida de documentos y/o expedientes y evitar la pérdida de información valiosa del FDLS.</p>
--	--



7. ANEXO CONTRACTUAL DE LA VIGENCIA 2019

Ver Anexo No 1.



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

8. ESTADOS FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2019

		SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA	
		NIT No. 899.999.061-9 ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019	
		(Cifras en pesos)	
		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
INGRESOS OPERACIONALES		79,296,792,614.00	81,782,055,959.56
41	INGRESOS FISCALES	669,519,611.00	739,327,959.56
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	669,519,611.00	739,327,959.56
411002	Multas	669,519,611.00	739,327,959.56
44	TRANSFERENCIAS	79,627,273,003.00	81,042,728,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	79,627,273,003.00	81,042,728,000.00
442802	Para proyectos de inversión	79,136,286,000.00	79,676,728,000.00
442803	Para gastos de funcionamiento	3,480,987,000.00	2,366,000,000.00
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	7,685,000.00	.00
442808	Donaciones	3,105,003.00	.00
GASTOS OPERACIONALES		55,770,071,714.06	40,078,069,962.44
51	ADMINISTRACION	16,777,395,260.00	16,051,462,046.55
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	129,991,600.00	133,416,656.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	106,637,900.00	102,385,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	23,353,700.00	31,031,156.00
5111	GENERALES	16,647,403,660.00	14,904,943,037.55
511113	Vigilancia y Seguridad	856,956,330.00	2,421,957,273.00
511114	Materiales y Suministros	505,434,961.00	295,156,789.00
511115	Mantenimiento	394,118,849.00	54,411,068.00
511116	Reparaciones	.00	9,832,375.00
511117	Servicios Públicos	114,379,874.00	112,200,587.55
511118	Arrendamiento	428,867,000.00	368,144,964.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripción	1,032,000.00	.00
511123	Comunicación y Transporte	326,767,720.00	166,361,720.00
511125	Seguros Generales	8,582,480.00	178,794,411.00
511133	Seguridad Industrial	.00	403,307.00
511137	Eventos Culturales	2,740,180.00	.00
511146	Combustibles y Lubricantes	85,250,013.00	73,162,434.00
511149	Servicio de Aseo y Cafetería	271,429,078.00	223,816,139.00
511154	Organización de Eventos	27,575,136.00	37,723,568.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	93,000.00	4,211,933.00
511164	Gastos Legales	.00	354,608.00
511165	Intangibles	245,371,684.00	.00
511179	HONORARIOS	13,245,427,258.00	10,279,628,214.00
511180	SERVICIOS	136,388,055.00	707,796,336.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	.00	13,102,353.00
512010	TASAS	.00	13,077,653.00
512027	Licencias	.00	24,700.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,975,079,680.06	637,845,854.88
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	257,425,740.08	26,369,139.89
534714	contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	257,425,740.08	26,369,139.89
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	696,442,136.00	611,477,665.00
536001	Edificaciones	65,890,742.00	42,271,264.00
536004	Maquinaria y equipo	184,393,767.00	177,201,737.00
536005	Muebles, enseres y equipos de oficina	64,021,601.00	54,434,190.00
536007	Equipo de comunicación y computación	197,048,475.00	137,042,940.00
536008	Equipo de transporte, tracción y elevación	188,087,551.00	200,527,564.00
5360	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,018,211,804.00	.00
536603	Administrativas	967,632,258.00	.00
536650	Otros Litigios y demandas	50,579,546.00	.00
56	GASTO PUBLICO SOCIAL	37,017,686,774.06	24,385,762,091.00
5601	EDUCACION	613,174,515.00	800,941,127.00
560106	Asignación de bienes y servicios	613,174,515.00	800,941,127.00



**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA**

**NIT No. 899.999.061-9
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
5502	SALUD	640,406,850.00	1,295,526,251.00
550205	Asignación de bienes y servicios	640,406,850.00	1,295,526,251.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	5,950,911,229.00	1,077,319,730.00
550506	Asignación Bienes y Servicios	5,950,911,229.00	1,077,319,730.00
5506	CULTURA	1,062,254,743.00	808,067,098.00
550605	Generales	.00	241,787,381.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	1,062,254,743.00	566,279,717.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	20,383,044,125.00	12,719,194,322.00
550705	Generales	11,662,000.00	.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	20,371,382,125.00	12,719,194,322.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,200,550,312.00	1,567,973,563.00
550801	Actividades de Conservación	1,058,399,022.00	150,000,000.00
550802	Actividades de recuperación	22,151,290.00	700,000,000.00
550803	Medio ambiente actividades de educación	.00	600,478,599.00
550806	Estudios y proyectos	.00	614,586.00
550807	Asistencia Técnica	120,000,000.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	.00	116,878,978.00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	7,167,255,000.00	6,119,840,000.00
555003	Para Asistencia Social	7,167,255,000.00	6,119,840,000.00
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>23,526,720,899.94</u>	<u>41,703,985,997.12</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>617,514,640.33</u>	<u>786,759,064.62</u>
48	OTROS INGRESOS	617,514,640.33	786,759,064.62
4802	FINANCIERO	65,889,248.44	243,181,837.33
480232	Remedios sobre recursos entregados en administración	65,889,248.44	174,872,807.38
480290	Otros ingresos financieros	.00	68,508,029.95
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	333,286,441.00	312,603,373.79
480815	FOTOCOPIAS	1,670,240.00	1,228,579.00
480825	Sobrantes	300,002.00	1.00
480826	Recuperaciones	323,169,835.00	250,819,986.00
480828	Indemnizaciones	.00	11,682,810.00
480890	Otros ingresos ordinarios	8,146,364.00	43,871,997.79
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	218,338,952.89	230,973,853.50
483002	Cuentas por cobrar	218,338,952.89	230,973,853.50
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>8,492,329,937.40</u>	<u>118,267,848.04</u>
58	OTROS GASTOS	8,492,329,937.40	118,267,848.04
5890	GASTOS DIVERSOS	8,492,329,937.40	118,267,848.04
589017	Pérdidas en siniestros	.00	2,789,168.00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	9,900,967.00	45,876,786.00
589025	Multas y Sanciones	351,554,625.40	69,481,894.35
589090	Otros gastos diversos	8,130,874,345.00	110,999.69
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación</u>	<u>15,551,905,602.87</u>	<u>42,372,477,213.70</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>15,551,905,602.87</u>	<u>42,372,477,213.70</u>

Nedil Arnulfo Santiago Romero
Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

Nohora Susana Perez
NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
1211481T

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
CORRIENTE	<u>97,505,204,366.82</u>	<u>110,179,099,178.70</u>		<u>7,132,473,310.81</u>	<u>8,297,168,630.81</u>
13 CUENTAS POR COBRAR	2,031,234,107.38	1,862,328,993.92	24 CUENTAS POR PAGAR	6,068,164,605.81	8,193,497,824.81
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,031,234,107.38	1,862,328,993.92	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,640,321,772.35	7,616,788,918.35
131102 MULTAS	2,031,234,107.38	1,862,328,993.92	240101 BIENES Y SERVICIOS	402,674,553.60	118,839,058.60
15 INVENTARIOS	126,351,292.00	173,510,874.00	240102 PROYECTOS DE INVERSION	5,237,647,218.75	7,497,949,859.75
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	126,351,292.00	173,510,874.00	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS	321,420,345.46	470,286,418.46
151030 Equipos de Comunicacion y Computacion	18,503,806.00	31,755,660.00	243605 Servicios	7,809,115.00	35,920,533.00
151034 Elementos de protección y seguridad personal	.00	6,934,176.00	243606 Arrendamientos	425,000.00	425,000.00
151035 Repuestos, equipos férreos y otros	2,924,308.00	2,924,308.00	243608 Compras	160,492,120.00	72,679,066.00
151037 Muebles y enseres	36,546,082.00	75,375,891.00	243615 Rentas de trabajo	666,313.96	1,718,442.96
151039 Material didáctico	11,599,516.00	11,599,516.00	243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	104,889,982.00	71,756,408.00
151041 Maquinaria y elementos de ferreteria	13,954,578.00	39,537,971.00	243627 Rte Ica Por Compras y Servicios	47,337,814.50	70,000,279.50
151061 Materiales médico - quirurgicos	33,320,000.00	.00	243690 Otras Retenciones	.00	217,786,689.00
151060 Otras mercancias en existencia	9,503,000.00	5,383,352.00	2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	57,804,294.00	57,804,294.00
19 OTROS ACTIVOS	<u>95,347,618,967.44</u>	<u>108,143,259,310.78</u>	244011 Licencias Registros y Salvoconductos	128,300.00	128,300.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327,485,950.00	327,485,950.00	244024 TASAS	57,675,994.00	57,675,994.00
190514 Bienes y Servicios	327,485,950.00	327,485,950.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,618,194.00	48,618,194.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,396,548,278.00	1,335,428,114.00	249055 Servicios	202,574.00	202,574.00
190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,396,548,278.00	1,335,428,114.00	249058 Arrendamiento operativo	19,864,725.00	19,864,725.00
			249060 Otras cuentas por pagar	28,550,895.00	28,550,895.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	93,621,584,739.44	106,480,345,246.78	27	PASIVOS ESTIMADOS	960,637,899.00	.00
190801	EN ADMINISTRACION	93,621,584,739.44	106,480,345,246.78	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	960,637,899.00	.00
				270103	Administrativas	95,494,965.00	.00
				270190	Otros litigios y demandas	865,142,934.00	.00
				29	OTROS PASIVOS	103,670,806.00	103,670,806.00
				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	103,670,806.00	103,670,806.00
				290304	Depósitos sobre contratos	103,670,806.00	103,670,806.00
	NO CORRIENTE	<u>56,300,029,165.40</u>	<u>35,852,078,467.57</u>		Total Pasivo	<u>7,132,473,310.81</u>	<u>8,297,168,630.81</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	3	PATRIMONIO		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	31	HACIENDA PUBLICA	146,672,760,221.41	137,734,009,015.46
138614	INGRESOS NO TRIBURARIOS	- 547,207,469.78	- 508,120,682.61	3105	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16,339,732,995.75	16,590,596,676.75	310505	CAPITAL FISCAL	54,847,107,366.87	54,847,107,366.87
1605	TERRENOS	7,781,425,710.00	3,921,505,710.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	76,173,747,251.57	30,664,450,128.78
160501	Urbanos	7,781,425,710.00	3,921,505,710.00	310901	Utilidades o excedentes acumulados	76,247,072,607.81	30,664,450,128.78
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	275,095,494.43	275,095,494.43	310902	Perdidas o deficits acumulados	- 73,325,356.14	.00
161501	Edificaciones	275,095,494.43	275,095,494.43	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,651,905,602.87	42,372,477,213.70
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	31,828,692.00	56,110,439.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	15,651,905,602.87	42,372,477,213.70
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	27,372,578.00	21,000,699.00	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	.00	9,849,974,306.11
163504	Equipos de comunicación y computacion	4,456,114.00	35,109,740.00	314503	Cuentas por cobrar	.00	- 712,726,393.22
				314506	Propiedad, planta y equipo	.00	11,210,115,917.93
				314507	Activos intangibles	.00	- 128,344.60
				314512	Otros activos	.00	- 949,270,370.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	176,900,794.00	3,871,825,743.00	314590	Otros impactos por transición	.00	301,983,496.00
163701	Terrenos	.00	3,667,067,860.00				
163707	Maquinaria y equipo	18,144,886.00	42,598,886.00		Total Patrimonio	<u>146,672,760,221.41</u>	<u>137,734,009,015.48</u>
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	41,769,766.00	24,667,200.00				
163710	Equipos de comunicación y computación	116,986,142.00	137,491,797.00				
1640	EDIFICACIONES	6,044,688,484.32	6,237,540,624.32				
164001	Edificios y casas	5,642,265,620.00	5,835,117,760.00				
164027	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	402,422,864.32	402,422,864.32				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	575,107,305.00	489,276,575.00				
165501	Equipo de Construcción	437,795,640.00	459,981,640.00				
165511	Herramientas y Accesorios	105,214,621.00	12,317,646.00				
165590	Otra maquinaria y equipo	32,097,044.00	6,977,289.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	732,702,720.00	683,034,323.00				
166501	Muebles y enseres	526,759,766.00	521,236,643.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	205,942,954.00	161,797,680.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	832,381,325.00	523,589,749.00				
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	34,886,445.00				
167002	Equipos de computación	824,786,325.00	488,703,304.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,140,152,148.00	1,107,966,148.00				

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
167502	Terrestre	1,140,152,148.00	1,107,966,148.00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 1,250,549,677.00	- 575,348,129.00			
168501	Edificaciones	- 68,337,365.00	- 19,944,409.00			
168504	Maquinaria y equipo	- 361,596,504.00	- 177,201,737.00			
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 116,902,230.00	- 54,389,020.00			
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 328,004,351.00	- 136,190,287.00			
168508	Equipos de transporte, traccion y E.	- 375,710,227.00	- 187,622,676.00			
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	40,507,503,639.43	19,769,602,473.43			
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	38,512,846,931.00	17,774,945,765.00			
170501	Red Carretera	38,512,846,931.00	17,774,945,765.00			
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	2,615,525,978.00	2,615,525,978.00			
171001	Red carretera	1,757,317,309.00	1,757,317,309.00			
171090	Otros bienes de uso público en servicio	858,208,669.00	858,208,669.00			
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PUBLICO (CR)	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
178590	Otros Bienes de Uso Publico	- 620,869,269.57	- 620,869,269.57			
Total Activo		<u>153,805,233,532.22</u>	<u>146,031,177,646.27</u>	Total Pasivo + Patrimonio	<u>153,805,233,532.22</u>	<u>146,031,177,646.27</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2019	DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	.00	.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	.00	.00
81	DERECHOS CONTINGENTES	6,366,658,016.87	6,854,395,594.87	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,967,282,962.00	391,949,560.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	6,366,658,016.87	6,854,395,594.87	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION	8,967,282,962.00	391,949,560.00
812004	Administrativas	6,366,658,016.87	6,854,395,594.87	912004	Administrativa	8,967,282,962.00	391,949,560.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,643,017.03	13,477,504.33	93	ACREEDORAS DE CONTROL	961,283,000.00	961,283,000.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	7,046,221.58	6,880,708.88	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	961,283,000.00	961,283,000.00
831510	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,046,221.58	6,880,708.88	930617	Propiedades planta y equipo	961,283,000.00	961,283,000.00
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6,596,795.45	6,596,795.45	99	ACREEDORES POR CONTRAS (DB)	- 9,928,565,962.00	- 1,353,232,560.00
836101	Internas	6,596,795.45	6,596,795.45	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 8,967,282,962.00	- 391,949,560.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 6,380,301,033.90	- 6,867,873,099.20	990505	Litigios y mecanismos de solución de conflictos.	- 8,967,282,962.00	- 391,949,560.00
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONT (CR)	- 6,366,658,016.87	- 6,854,395,594.87	9915	ACREEDORES DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
890505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion	- 6,366,658,016.87	- 6,854,395,594.87	991502	Bienes recibidos en custodia	- 961,283,000.00	- 961,283,000.00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 13,643,017.03	- 13,477,504.33				
891506	Bienes y derechos retirados	- 7,046,221.58	- 6,880,708.88				
891521	Responsabilidades en proceso	- 6,596,795.45	- 6,596,795.45				

Nedil Arnulfo Santiago Romero
ALCALDE LOCAL

NOHORA SUSANA PEREZ
CONTADOR
121148-T
